AR Prefecture

043-214302242-20250918-2025_09_01-DE
Reçu le 23/09/2025

Service de l’eau

Commune de Sainte Sigolène

Procès-verbal de mise à disposition des biens du service

AR Prefecture
043-214302242-20250918-2025_09_01-DE
Reçu le 23/09/2025

Table des matières

1. **ARTICLE 1 - OBJET** 3
ARTICLE 2 – SITUATION JURIDIQUE DES BIENS 3
ARTICLE 3 – INVENTAIRE DES BIENS 3
ARTICLE 4 - MODALITES DE LA MISE A DISPOSITION 3
ARTICLE 5 - CONTRATS EN COURS 3
ARTICLE 6 - AMORTISSEMENT DES BIENS 4
ARTICLE 7 – DUREE DE LA MISE A DISPOSITION / DESAFFECTATION DES BIENS 4
ARTICLE 8 – COMPTABILISATION DU TRANSFERT 4
Annexe 1 – Inventaire des ouvrages de distribution d'eau potable mis à disposition 5
1. **Le réseau** 5
2. **Les ouvrages de traitement** 7
3. **Les ouvrages de pompage** 7
4. **Les réservoirs** 38
5. **Etat des ouvrages de stockage et pompage** 45
6. **Les compteurs généraux** 46
7. **Les ouvrages de régulation** 47
8. **Les équipements de réseau** 47
Annexe 2 - État des immobilisations transférées au 31 décembre 2024 pour la compétence eau : 48
Annexe 3 - État des subventions transférables au 31 décembre 2024 pour la compétence eau : 49
Annexe 4 État des emprunts transférés au 31 décembre 2024 pour la compétence eau : 53

AR Prefecture
043-214302242-20250918-2025_09_01-DE
Reçu le 23/09/2025

Procès-verbal de mise à disposition de biens dans le cadre du transfert de la compétences eau de la Commune de Sainte Sigolène à la Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron

ETABLI ENTRE :

La Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron sise ZA la Borie 1 - 9, rue de l'Épée 43120 SAINTE SIGOLÈNE, représentée par Monsieur Xavier DELPY, son Président, agissant en vertu de la délibération n° CCMVR24-11-19-12 en date du 19/11/2024, ci-après dénommée « la CCMVR »,

D'une part,

La Commune de Sainte Sigolène place Jean Salque, 43600 STE SIGOLENE, représentée par son Maire, Monsieur Didier Rouchouse, agissant en vertu d'une délibération du Conseil municipal en date du 18 septembre 2025, ci-après dénommée « *la Commune* »,

D'autre part,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1321-1 et suivants, L.5211-17, L.5211-4-1, L.5211-5 ;
Vu les arrêtés préfectoraux n° BCTE/2023/146 et 147 du 18 décembre 2023 constatant respectivement le transfert des compétences « eau » et « assainissement » à la Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron (CCMVR) au 1er janvier 2025 ;
Considérant que la CCMVR exerce conformément à ses statuts la compétence eau potable à compter du 01/01/2025 ;
Considérant que la commune de Sainte Sigolène est propriétaire des ouvrages constituant le service d'eau;
Considérant que conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L.1321-1 du Code général des collectivités territoriales, le transfert des dites compétences entraîne de plein droit la mise à disposition de la CCMVR des biens meubles et immeubles utilisés, à la date du transfert, pour l'exercice de cette compétence ;
Considérant que cette mise à disposition, conformément au second alinéa de l'article L.1321-1 du Code général des collectivités territoriales, est constatée par un procès-verbal contradictoire, entre la commune de Sainte Sigolène et la CCMVR.

AU VU DE CES DISPOSITIONS, EST ETABLI LE PROCES-VERBAL DE CONSTAT DE MISE A DISPOSITION SUIVANT

ARTICLE 1 - OBJET

Par le présent procès-verbal, la Commune de Sainte Sigolène met à la disposition de la CCMVR les biens mobiliers et immobiliers affectés à l'exercice des compétences eau et assainissement.

Cette mise à disposition est consentie dans les conditions précisées dans les articles ci-après.

ARTICLE 2 – SITUATION JURIDIQUE DES BIENS

La Commune déclare :
- que les biens concernés sont situés sur son territoire,
- qu'elle est le valable propriétaire des biens, objets de la présente mise à disposition.

ARTICLE 3 – INVENTAIRE DES BIENS

L'inventaire des biens meubles et immeubles mis à disposition de la CCMVR par la Commune est listé en annexe au présent procès-verbal.

L'inventaire annexé au présent procès-verbal, fait état de :
• la consistance du bien,
• de la parcelle cadastrale concernée, de l'état d'amortissement [le cas échéant],
• des éventuels contentieux en cours afférents à ces biens,
• des travaux en cours de passation ou d'exécution afférents à ces biens (montant, nature et références de contrats),
• de la conformité des sols et des ouvrages au regard des prescriptions résultant de la police des installations classées et de la police de l'eau,
• de l'état général dudit bien

ARTICLE 4 - MODALITES DE LA MISE A DISPOSITION

Conformément à l'article L 1321-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, la présente mise à disposition est consentie à titre gratuit.

La CCMVR, bénéficiaire de la présente mise à disposition, assume, du fait du transfert de la compétence eau, l'ensemble des droits et obligations du propriétaire sur les biens énumérés en annexe au présent procès-verbal.

Elle possède tous pouvoirs de gestion. Elle assure le renouvellement des biens mobiliers et autorise l'occupation des biens remis. Elle en perçoit les fruits et produits. Elle agit en justice en lieu et place du propriétaire (soit la Commune).

La CCMVR peut procéder à tous les travaux de reconstruction, de démolition ou d'addition de construction propres à assurer le maintien de l'affectation des biens.

ARTICLE 5 - CONTRATS EN COURS

AR Prefecture
043-214302342-20250918-2025_09_01-DE
Reçu le 23/09/2025

La CCMVR se substitue dans les droits et obligations de la Commune en ce qui concerne les éventuelles subventions ayant servi à financer les biens et l'ensemble des contrats en cours, notamment les contrats d'emprunt relatifs aux biens mis à disposition (voir la liste des emprunts et subventions transférés en annexe au présent procès-verbal).
La Commune constate la substitution qui fera l'objet d'une notification à ses cocontractants.

ARTICLE 6 - AMORTISSEMENT DES BIENS

Les parties actent que la CCMVR poursuit l'amortissement des biens mis à disposition et des subventions afférentes, le cas échéant, conformément à ses propres règles.

ARTICLE 7 – DUREE DE LA MISE A DISPOSITION / DESAFFECTATION DES BIENS

La mise à disposition des biens s'opère sans limitation de durée. Elle prend effet rétroactivement, à la date du transfert effectif de la compétence eau soit le 1er janvier 2025.

Conformément aux dispositions de l'article L.1321-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, en cas de désaffectation totale ou partielle des biens, la Commune recouvrera l'ensemble de ses droits et obligations sur les biens désaffectés.

Les parties déclarent que le présent transfert ne donne lieu à aucune indemnité, droit, taxe, contribution ou honoraires, conformément à l'article 1043 modifié du Code Général des Impôts.

Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l'exécution du présent procès-verbal de mise à disposition, relèvera de la compétence du Tribunal Administratif de Le Puy en Velay.

Les parties s'engagent cependant à rechercher, préalablement, une solution amiable au litige.

ARTICLE 8 – COMPTABILISATION DU TRANSFERT

La présente mise à disposition sera comptablement constatée par opération d'ordre non budgétaire.

Pour la Commune,
Le Maire,

Pour la CCMVR,
Le Président,

AR Prefecture
043-214302212-20250918-2025_09_01-DE
Reçu le 23/09/2025

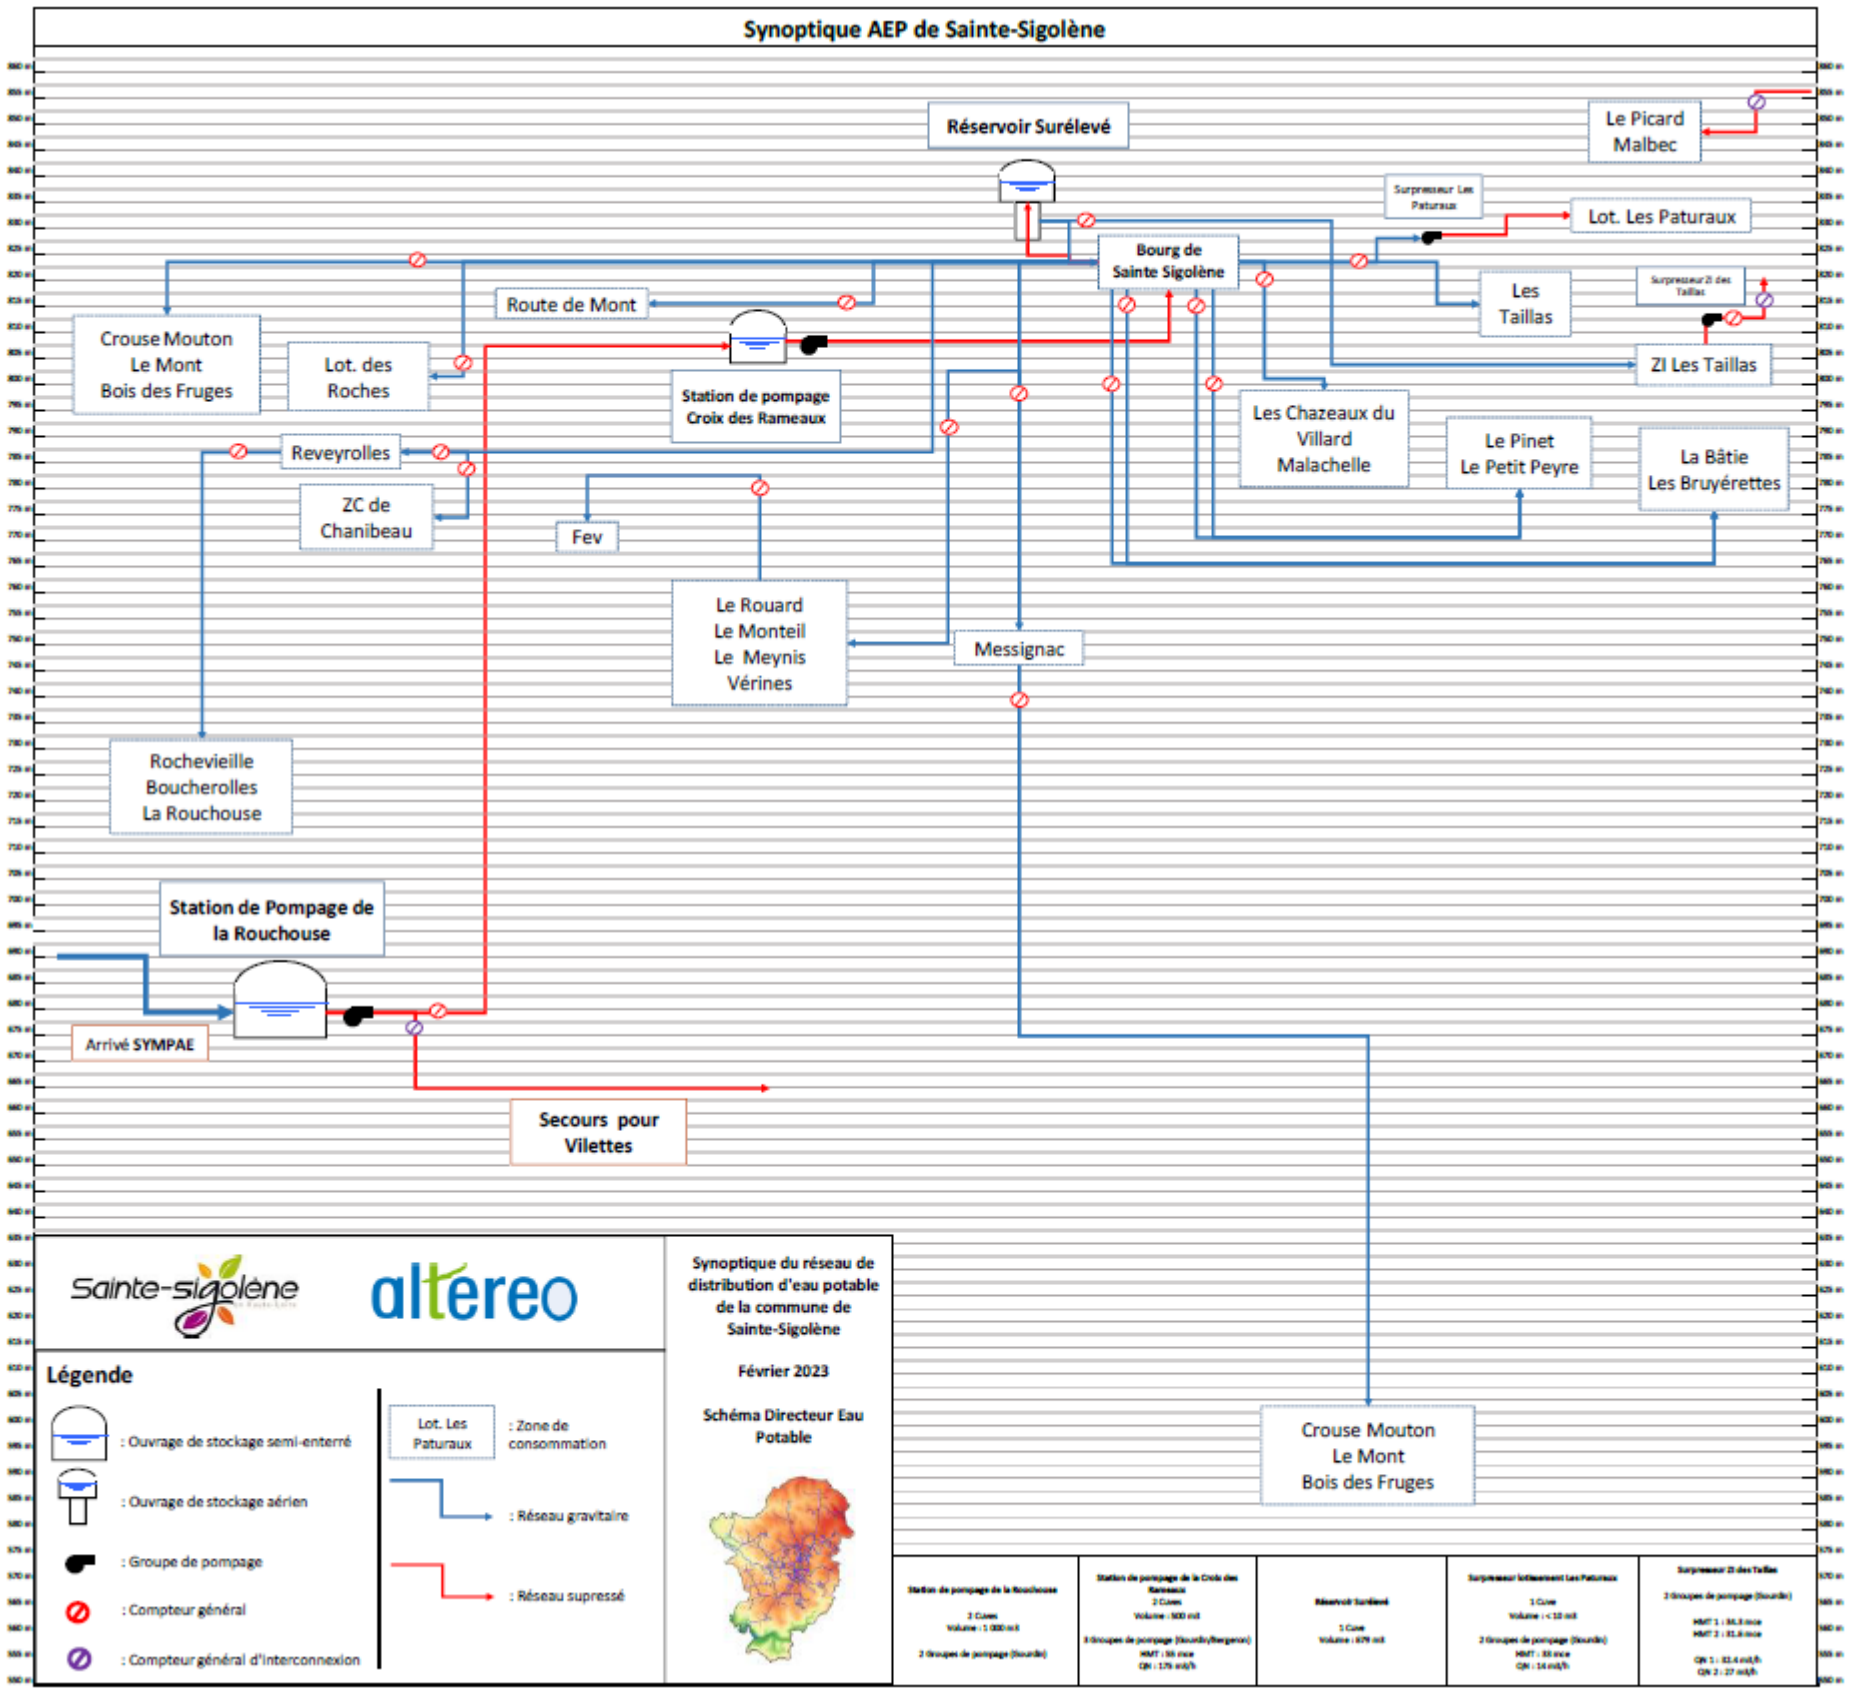

1. **<u>Le réseau</u>**

AR Prefecture
043-214302242-20250918-2025_09_01-DE
Reçu le 23/09/2025

La longueur totale du réseau est de 104,7 km

Matériaux	Linéaire (ml)	Pourcentage du linéaire (%)
--	34	0.14%
ACIER	5 212	1.83%
FONTE	10 119	6.20%
Pe	5 260	8.66%
PVC	39 242	50.12%
PVC_1980	42 562	22.08%
PVC_COMPOSITE_BO	321	1.15%
(vide)	1 957	9.81%
Total général	**104 707**	**100.00%**

Diamètres	Linéaire (ml)	% du linéaire
32	894	0.72%
40	6 093	4.57%
50	10 870	6.78%
60	394	0.82%
63	**33 015**	**26.21%**
75	3 778	1.54%
80	555	0.53%
90	2 082	1.15%
100	1 138	1.25%
110	**20 794**	**27.22%**
125	3 798	4.86%
140	1 093	1.88%
150	2 214	1.97%
160	789	2.12%
175	4 502	0.63%
200	6 891	3.27%
250	226	0.29%
--	29	0.19%
(vide)	5 553	14.00%
Total	**104 707**	**100.00%**

Date ou période de pose	Linéaire (ml)	% du linéaire
0	86	0.14%
2000	345	0.96%
2001	332	0.87%
2006	357	0.14%
2007	398	0.82%
2008	122	0.14%
2010	925	0.72%
2013	742	2.07%
2014	295	0.38%
2016	225	0.29%
2017	132	0.58%
2018	935	0.24%
2019	83	0.05%
2020	3 757	3.70%
2021	266	0.24%
2022	191	0.29%
Avant 1980	42 562	40.00%
Vide	52 953	50.00%
Total général	**104707**	**100.00%**

AR Prefecture
043-214302242-20250918-2025_09_01-DE
Reçu le 23/09/2025

2. Les ouvrages de traitement

La commune de Sainte Sigolène ne présente aucun ouvrage de traitement. L'eau brute provient de la prise d'eau sur la conduite forcée du Lignon, et est ensuite traitée à la station du SYMPAE sur la commune de Monistrol sur Loire.

L'eau est ensuite acheminée à la station de pompage de la Rouchouse sur la commune de Sainte Sigolène, où elle est chlorée avant distribution.

3. Les ouvrages de pompage

Nom de l'ouvrage	Nombre de pompes	Marque/ Fournisseur	Mise en service	Débit (m3/h)	HMT (m)	Puissance (KW)	Temps de fonctionnement actuel (par jour)	Fonctionnement général
Station de pompage de La Rouchouse	2	Pompe Gourdin	1957	150	170	89.2	En fonction des besoins	Adduction
Station de pompage La Croix des Rameaux	3	Pompe Gourdin / Licence Bergeron	1986	175	55	34.0	En fonction des besoins	Adduction / Distribution
Surpresseur du Lotissement des Paturaux	2	Flygt	2002	6 - 14	62 - 33	2.2	En fonction des besoins	Distribution
Surpresseur des Taillas	2	KSB Movitec	2010	27	31.6	4.0	En fonction des besoins	Distribution
			2018	32.4	34.3	5.5		

AR Prefecture
043-214302242-20250918-2025_09_01-DE
Reçu le 23/09/2025

Station de pompage La Rouchouse

altereo

Station de reprise ou de surpression

Sainte-sigolène

FICHE OUVRAGE EAU POTABLE

Identification

Nom usuel	Station de pompage La Rouchouse	**Plan de localisation**
Commune d'implantation	Sainte Sigolène	
Lieux dit / adresse	La Rouchouse	
Commentaires	/	
Coordonnées IGN 69 RGF Lambert 93 - 2154	X : 793637.878	
	Y : 6462385.424	
	Z : 680.057 mNGF	

Généralités

Date de mise en service	1957
Type de bâche d'aspiration	☐ Aérien ☐ Enterré ☒ Semi-enterré ☐ Posé au sol ☐ Inconnu ☐ Autre
Forme de la bâche	☒ Circulaire ☒ Rectangulaire ☐ Indéterminé ☐ Autres
Nombre de cuve	2 Cuves
Volume (m3)	1000
Cotes entrée/sortie	Entrée : 680.907 mNGF / Sortie : 679.607 mNGF
Cote trop plein	682.457 mNGF *(A vérifier car cuve pleine)*
Cote radier	680.057 mNGF
Cote sol	680.057 mNGF
Type d'alimentation	☐ Gravitaire robinet flotteur ☒ Gravitaire régulé ☐ Arrivée pompage ☐ Indéterminé ☐ Autre
Autonomie de stockage (h)	/
Réserve incendie	☐ Oui Volume de la réserve (m3) ☐ Non ☐ Non concerné ☒ Indéterminé
Temps de séjour (h)	Moyen : / / Pointe : /
Origine de l'eau	Coté NGF de l'arrivée : ☒ Réservoir ➔ Nom : Réservoir de Pont Chazeaux
Destination de l'eau	Coté NGF du départ : ☒ Station de pompage ➔ Nom : Croix des Rameaux

Caractéristiques des pompes

Nombre de pompes	2 Groupes de pompe
HMT	170 mce
Marque/Modèle	Pompes Gourdin
Age	-
Type pompage	☐ Surpresseur en ligne ☐ Pompage immergé ☒ Pompage aspiration ☐ Inconnu ☐ Autre
Etat	☐ Très bon état ☒ Présence des traces de vieillissement ☐ Dégradation généralisée ☐ Ne remplis plus sa fonction ☐ Inconnu
Débit nominal (m3/h)	150
Niveau de démarrage	-
Niveau d'arrêt	-
Puissance absorbée (KWh)	89,2
Variateur de fréquence	☐ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☒ Indéterminé
Temporisation marche	☐ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☒ Indéterminé
Temporisation arrêt	☐ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☒ Indéterminé

AR Prefecture
043-214302242-20250918-2025_09_01-DE
Reçu le 23/09/2025

Exploitation / Maintenance

Vidange et nettoyage	*Fréquence visite ouvrage*	☒ Quotidienne ☐ Hebdomadaire ☐ Mensuel ☐ Annuel ☐ Indéterminé ☐ Non concerné
	Fréquence vidange/nettoyage	☐ Hebdomadaire ☐ Mensuel ☒ Annuel ☐ Indéterminé ☐ Non concerné
	Fréquence entretiens espaces vert	☐ Hebdomadaire ☐ Mensuel ☒ Annuel ☐ Indéterminé ☐ Non concerné
Sécurité	*Produits dangereux à manipuler*	☒ Oui Type : ☐ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
	Produits dangereux à manipuler fréquence	☐ Hebdomadaire ☐ Mensuel ☐ Annuel ☒ Indéterminé ☐ Non concerné
	Dispositif harnais	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
	Dispositif harnais conformité	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Aération	*Aération basse*	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
	Aération haute	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
	Système antigel	☐ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☒ Indéterminé
Electricité	*Alimentation électrique*	☒ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
	Sécurité électrique	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
	Eclairage	☒ Electrique ☐ Naturel ☐ Non concerné ☐ Autre

Accès et protection du site

Voie d'accès	☐ Piétonnier ☐ Revêtue ☒ Voie carrossable VP ☐ Voie carrossable 4x4 ☐ Voie non carrossable ☐ Non accessible ☐ Non accessible ☐ Autre ☐ Inconnu
Présence portail	☒ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Portail verrouillage	☒ Porte 2 battants ☐ Barrière mobile ☐ Volet roulant ☐ Non concerné ☐ Autre
Type de terrain	☐ Public ☒ Privé ☐ Indéterminé
Présence de clôture	☒ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Panneau d'interdiction	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Présence de porte	☒ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Verrouillage porte	☒ Porte 1 point ☐ Porte 2 points ☐ Porte 3 points ☐ Non concerné ☐ Autre
Dispositif anti-intrusion	☒ Oui Type : Rapatriement de l'alarme : ☐ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Fenêtres sécurisées	☐ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☒ Indéterminé
Sécurisation de l'accès à l'eau	☒ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé

Génie civil

Etat global	☐ Correct ☒ Légèrement dégradé ☐ Fortement dégradé ☐ Inconnu
Désordre extérieur	☐ Micro fissure ☐ Fissure ☐ Lézarde ☐ Spectre d'armature ☐ Armature apparante ☒ Epaufrures ☐ Traces d'humidité ☐ Moisissures ☐ Autre
Etat extérieur bâti	☒ Correct ☐ Légèrement dégradé ☐ Fortement dégradé ☐ Inconnu
Désordre intérieur	☒ Micro fissure ☐ Fissure ☐ Lézarde ☐ Spectre d'armature ☐ Armature apparante ☐ Epaufrures ☒ Traces d'humidité ☒ Moisissures ☐ Autre
Etat intérieur bâti	☐ Correct ☒ Légèrement dégradé ☐ Fortement dégradé ☐ Inconnu
Etat équipements	☐ Très bon état ☒ Présence des traces de vieillissement ☐ Dégradation généralisée ☐ Ne remplis plus sa fonction ☐ Inconnu
Sécurité garde-corps	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Sécurité échelle	☐ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Etat échelle	☒ Très bon état ☐ Présence des traces de vieillissement ☐ Dégradation généralisée ☐ Ne remplis plus sa fonction ☐ Inconnu

AR Prefecture
043-214302242-20250918-2025_09_01-DE
Reçu le 23/09/2025

Station de reprise ou de surpression

FICHE OUVRAGE EAU POTABLE

Supervision/Equipements

Télégestion	☐ Oui	☒ Non	☐ Non concerné	☐ Indéterminé			
Modèle télégestion							
Télécommande	☐ Oui	☐ Non	☐ Non concerné	☐ Indéterminé			
Antenne télécom	☐ GSM	☐ RTC	☐ GPRS	☐ ADSL	☐ Radio	☐ Indéterminé	☐ Autre
Mode communication	☐ Oui	☐ Non	☐ Non concerné	☒ Indéterminé			
Poire de niveau	☒ Oui	☐ Non	☐ Non concerné	☐ Indéterminé			
Alarmes niveau	☒ Oui	☐ Non	☐ Non concerné	☐ Indéterminé			
Sonde de niveau	☒ Oui	☐ Non	☐ Non concerné	☐ Indéterminé			
Niveau télétransmission	☐ Oui	☐ Non	☐ Non concerné	☒ Indéterminé			

Suivi qualitatif/quantitatif

Suivi qualitatif	☒ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé	
Suivi quantitatif	☒ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé	
Robinets de prélèvement	☒ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé	
Désinfection	***Désinfection***	☒ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
	Type de désinfection	☐ Javel ☐ UV ☒ Chlore liquide régulé ☐ Chlore gazeux régulé ☐ Bioxyde ☐ Autre ☐ Inconnu
	Asservissement désinfection	☐ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☒ Indéterminé
	Point d'injection	☐ Cuve ☒ Départ distribution ☐ Non concerné ☐ Indéterminé ☐ Autre
	Stockage réactif	☒ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
	Chloromètre	☒ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Turbidimètre	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé	
Mélange d'eau	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé	
Sonde de température	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé	
Autocontrôle	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé	
Commentaires		

Remarques

- Priorité sur la révision ou le renouvellement des pompes sur ces deux secteurs avec passage en alternatif + armoire électrique.
- Le ballon anti bélier va être déplacé.
- Le génie civil au niveau du bâtiment technique (toilettes, salle à manger, etc.) est très dégradé, avec une toiture qui présente des soucis d'étanchéité. Un diagnostic génie civil est à prévoir au niveau de ce bâtiment, et permettra de connaitre les aménagements à mettre en place sur le site.
- Le revêtement au niveau des cuves a était repris, le risque de relargage de matériaux a été réduit.
- Le compteur en sortie de station date de 2020.
- Les canalisations au niveau du départ du secours pour les villette présente des traces de vieillissements.

AR Prefecture
043-214302242-20250918-2025_09_01-DE
Reçu le 23/09/2025

Photos

Vue d'ensemble

Pompes

Photos diverses

AR Prefecture
043-214302242-20250918-2025_09_01-DE
Reçu le 23/09/2025

FICHE OUVRAGE EAU POTABLE

AR Prefecture
043-214302242-20250918-2025_09_01-DE
Reçu le 23/09/2025

AR Prefecture
043-214302242-20250918-2025_09_01-DE
Reçu le 23/09/2025

FICHE OUVRAGE EAU POTABLE

AR Prefecture
043-214302242-20250918-2025_09_01-DE
Reçu le 23/09/2025

FICHE OUVRAGE EAU POTABLE

Schéma de principe

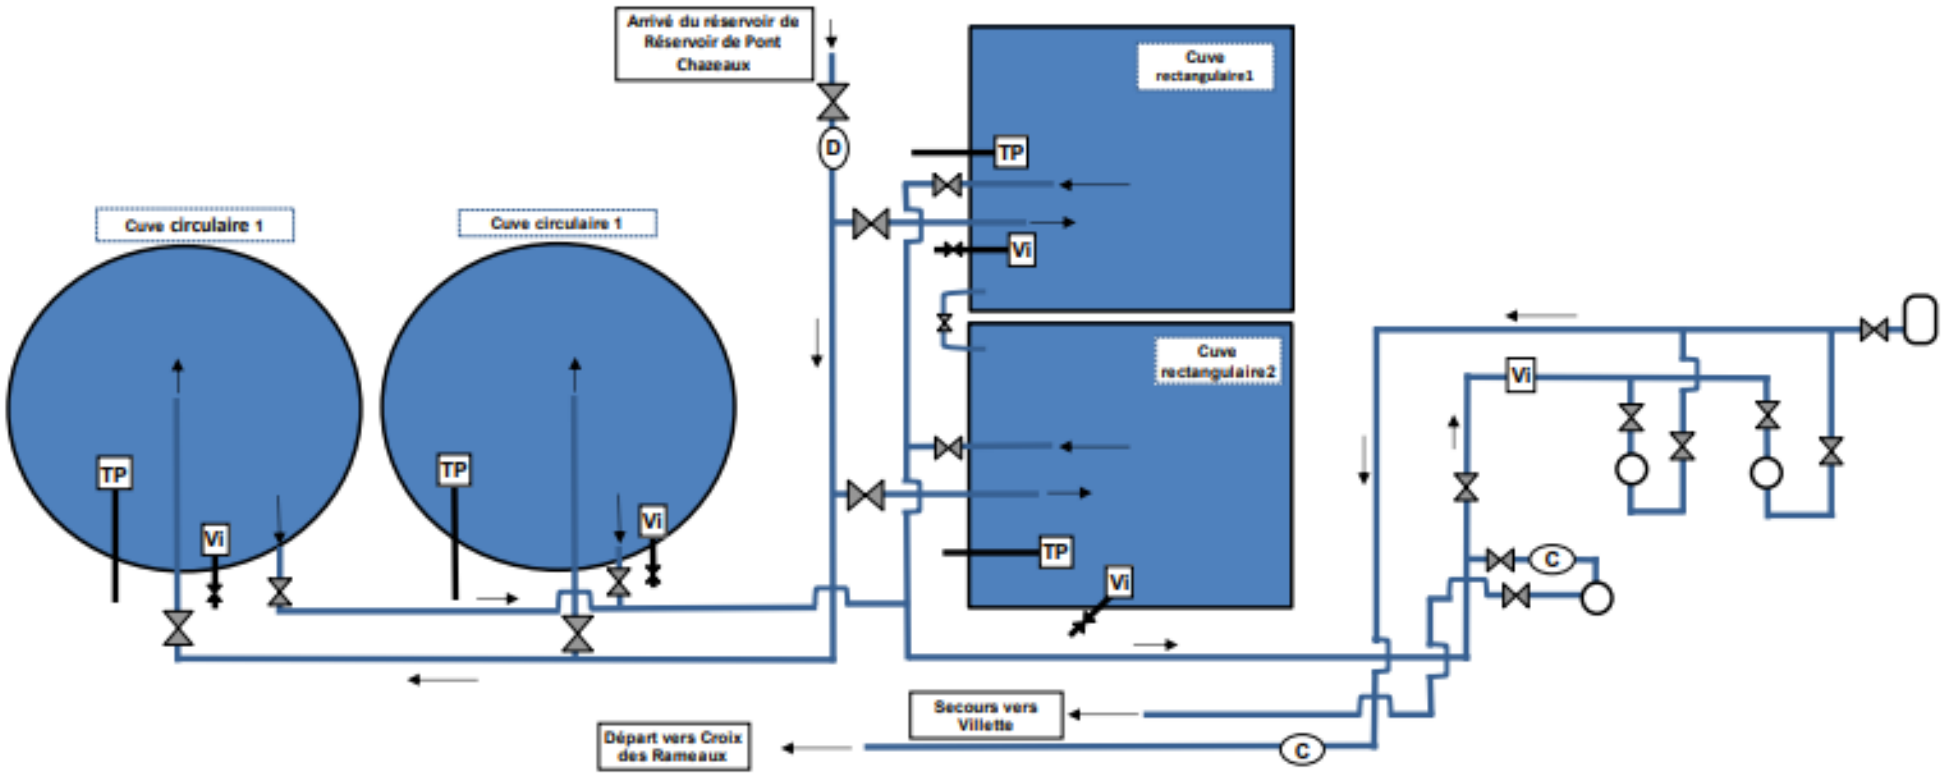

Légende

—	Conduites	Vi	Vidange
TP	Trop plein	⋈	Vanne fermée
○	Pompes		Ventouse
⋈	Vanne ouverte	▶	Clapet anti-retour
▢	Ballon anti-bélier	C	Compteur

altereo Station de reprise ou de surpression Sainte-Sigolène

FICHE OUVRAGE EAU POTABLE

Profil et cotes

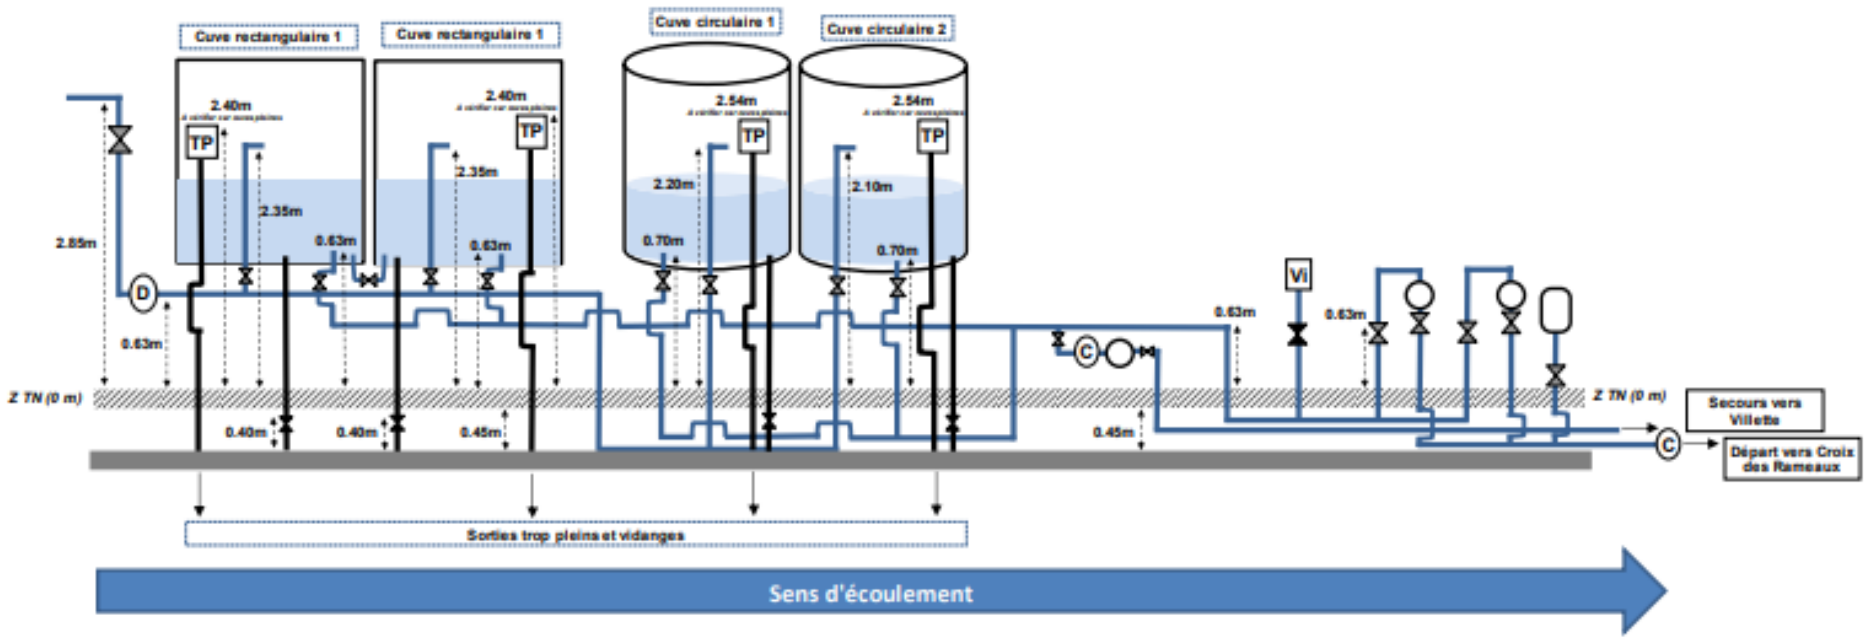

Légende

—	Conduites	Vi	Vidange
TP	Trop plein	⋈	Vanne fermée
○	Pompes		Ventouse
⋈	Vanne ouverte	▶	Clapet anti-retour
▢	Ballon anti-bélier	C	Compteur

AR Prefecture
043-214302242-20250918-2025_09_01-DE
Reçu le 23/09/2025

Station de reprise ou de surpression

FICHE OUVRAGE EAU POTABLE

Identification

Nom usuel	Station de pompage Croix des Rameaux	**Plan de localisation**
Commune d'implantation	Sainte Sigolène	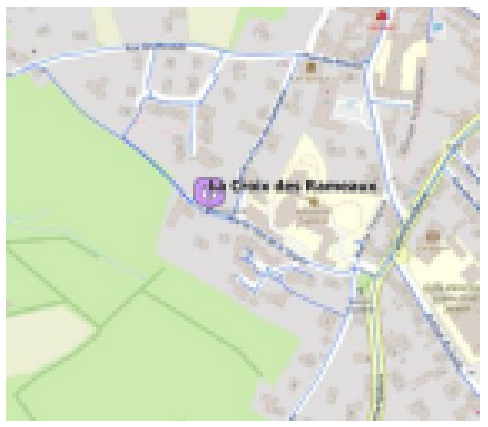
Lieux dit / adresse	Croix des Rameaux	
Commentaires	/	
Coordonnées IGN 69 RGF Lambert 93 - 2154	X : 796526.265	
	Y : 6460897.132	
	Z : 807.497 mNGF	

Généralités

Date de mise en service	-
Type de bâche d'aspiration	☐ Aérien ☐ Enterré ☒ Semi-enterré ☐ Posé au sol ☐ Inconnu ☐ Autre
Forme de la bâche	☒ Circulaire ☐ Rectangulaire ☐ Indéterminé ☐ Autres
Nombre de cuve	2 Cuves
Volume (m3)	1000
Cotes entrée/sortie	Entrée : 806.197 mNGF / Sortie : 806.037 mNGF
Cote trop plein	810.297 mNGF
Cote radier	805.397 mNGF
Cote sol	807.497 mNGF
Type d'alimentation	☐ Gravitaire robinet flotteur ☒ Gravitaire régulé ☒ Arrivée pompage ☐ Indéterminé ☐ Autre
Autonomie de stockage (h)	/
Réserve incendie	☐ Oui Volume de la réserve (m3) ☐ Non ☐ Non concerné ☒ Indéterminé
Temps de séjour (h)	Moyen : - / Pointe : -
Origine de l'eau	Coté NGF du départ : ☒ Station de pompage ➔ Nom : Station de pompage de La Rouchouze
Destination de l'eau	Coté NGF de l'arrivée : ☒ Réservoir ➔ Nom : Réservoir Surélevé de Sainte Sigolène

Caractéristiques des pompes

Nombre de pompes	3 Pompes
HMT	55
Marque/Modèle	Pompes Gourdin – Licence Bergeron
Age	-
Type pompage	☐ Surpresseur en ligne ☐ Pompage immergé ☒ Pompage aspiration ☐ Inconnu ☐ Autre
Etat	☐ Très bon état ☒ Présence des traces de vieillissement ☐ Dégradation généralisée ☐ Ne remplis plus sa fonction ☐ Inconnu
Débit nominal (m3/h)	175
Niveau de démarrage	-
Niveau d'arrêt	-
Puissance absorbée (KWh)	34.6
Variateur de fréquence	☒ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Temporisation marche	☐ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☒ Indéterminé
Temporisation arrêt	☐ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☒ Indéterminé

AR Prefecture
043-214302242-20250918-2025_09_01-DE
Reçu le 23/09/2025

FICHE OUVRAGE EAU POTABLE

Exploitation / Maintenance

Vidange et nettoyage	*Fréquence visite ouvrage*	☒ Quotidienne ☐ Hebdomadaire ☐ Mensuel ☐ Annuel ☐ Indéterminé ☐ Non concerné
	Fréquence vidange/nettoyage	☐ Hebdomadaire ☐ Mensuel ☒ Annuel ☐ Indéterminé ☐ Non concerné
	Fréquence entretiens espaces vert	☐ Hebdomadaire ☐ Mensuel ☒ Annuel ☐ Indéterminé ☐ Non concerné
Sécurité	*Produits dangereux à manipuler*	☐ Oui Type : ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
	Produits dangereux à manipuler fréquence	☐ Hebdomadaire ☐ Mensuel ☐ Annuel ☒ Indéterminé ☐ Non concerné
	Dispositif harnais	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
	Dispositif harnais conformité	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Aération	*Aération basse*	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
	Aération haute	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
	Système antigel	☐ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☒ Indéterminé
Electricité	*Alimentation électrique*	☒ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
	Sécurité électrique	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
	Eclairage	☒ Electrique ☐ Naturel ☐ Non concerné ☐ Autre

Accès et protection du site

Voie d'accès	☐ Piétonnier ☐ Revêtue ☒ Voie carrossable VP ☐ Voie carrossable 4x4 ☐ Voie non carrossable ☐ Non accessible ☐ Non accessible ☐ Autre ☐ Inconnu
Présence portail	☒ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Portail verrouillage	☒ Porte 2 battants ☐ Barrière mobile ☐ Volet roulant ☐ Non concerné ☐ Autre
Type de terrain	☐ Public ☒ Privé ☐ Indéterminé
Présence de clôture	☒ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Panneau d'interdiction	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Présence de porte	☒ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Verrouillage porte	☒ Porte 1 point ☐ Porte 2 points ☐ Porte 3 points ☐ Non concerné ☐ Autre
Dispositif anti-intrusion	☒ Oui Type : Rapatriement de l'alarme : ☐ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Fenêtres sécurisées	☐ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☒ Indéterminé
Sécurisation de l'accès à l'eau	☒ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé

Génie civil

Etat global	☐ Correct ☒ Légèrement dégradé ☐ Fortement dégradé ☐ Inconnu
Désordre extérieur	☒ Micro fissure ☐ Fissure ☐ Lézarde ☐ Spectre d'armature ☐ Armature apparente ☐ Epaufrures ☐ Traces d'humidité ☐ Moisissures ☐ Autre
Etat extérieur bâti	☒ Correct ☐ Légèrement dégradé ☐ Fortement dégradé ☐ Inconnu
Désordre intérieur	☒ Micro fissure ☐ Fissure ☐ Lézarde ☐ Spectre d'armature ☐ Armature apparente ☐ Epaufrures ☒ Traces d'humidité ☒ Moisissures ☐ Autre
Etat intérieur bâti	☐ Correct ☒ Légèrement dégradé ☐ Fortement dégradé ☐ Inconnu
Etat équipements	☐ Très bon état ☒ Présence des traces de vieillissement ☐ Dégradation généralisée ☐ Ne remplis plus sa fonction ☐ Inconnu
Sécurité garde-corps	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Sécurité échelle	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Etat échelle	☐ Très bon état ☒ Présence des traces de vieillissement ☐ Dégradation généralisée ☐ Ne remplis plus sa fonction ☐ Inconnu

AR Prefecture
043-214302242-20250918-2025_09_01-DE
Reçu le 23/09/2025

altereo

Station de reprise ou de surpression

FICHE OUVRAGE EAU POTABLE

Supervision/Equipements

Télégestion	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Modèle télégestion	-
Télécommande	☒ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Antenne télécom	☐ GSM ☐ RTC ☐ GPRS ☐ ADSL ☐ Radio ☐ Indéterminé ☐ Autre
Mode communication	☐ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☒ Indéterminé
Poire de niveau	☒ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Alarmes niveau	☒ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Sonde de niveau	☒ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Niveau télétransmission	☐ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☒ Indéterminé

Suivi qualitatif/quantitatif

Suivi qualitatif	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé	
Suivi quantitatif	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé	
Robinets de prélèvement	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé	
Désinfection	***Désinfection***	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
	Type de désinfection	☐ Javel ☐ UV ☐ Chlore liquide régulé ☐ Chlore gazeux régulé ☐ Bioxyde ☐ Autre ☐ Inconnu
	Asservissement désinfection	☐ Oui ☐ Non ☒ Non concerné ☐ Indéterminé
	Point d'injection	☐ Cuve ☐ Départ distribution ☒ Non concerné ☐ Indéterminé ☐ Autre
	Stockage réactif	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
	Chloromètre	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Turbidimètre	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé	
Mélange d'eau	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé	
Sonde de température	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé	
Autocontrôle	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé	
Commentaire libre		

Remarques

- Priorité sur la révision ou le renouvellement des pompes sur ces deux secteurs avec passage en alternatif + armoire électrique *(Pompes Gourdin – Licence Bergeron)*.
- Pose d'un point de comptage (débitmètre électromagnétique ou compteur avec tête filaire électromagnétique) raccordé au boitier de communication présent au niveau de la station de pompage. Cette pose de point de comptage s'inscrits dans la démarche d'amélioration de la sectorisation du réseau AEP de Ste Sigolène dans le schéma directeur AEP.
- Canalisations présentant des traces de vieillissement (rouille) dans la chambre de vannes.
- Pas de sécurisation au niveau de l'accès aux cuves. Pas de crinoline ni de points d'ancrage au niveau de l'échelle. Une amélioration au niveau de cet accès est à prévoir.

AR Prefecture
043-214302242-20250918-2025_09_01-DE
Reçu le 23/09/2025

Photos

Vue d'ensemble

Pompes

altereo Station de reprise ou de surpression Sainte-sigolène
FICHE OUVRAGE EAU POTABLE

Photos diverses

AR Prefecture
043-214302242-20250918-2025_09_01-DE
Reçu le 23/09/2025

FICHE OUVRAGE EAU POTABLE

AR Prefecture
043-214302242-20250918-2025_09_01-DE
Reçu le 23/09/2025

FICHE OUVRAGE EAU POTABLE

AR Prefecture
043-214302242-20250918-2025_09_01-DE
Reçu le 23/09/2025

FICHE OUVRAGE EAU POTABLE

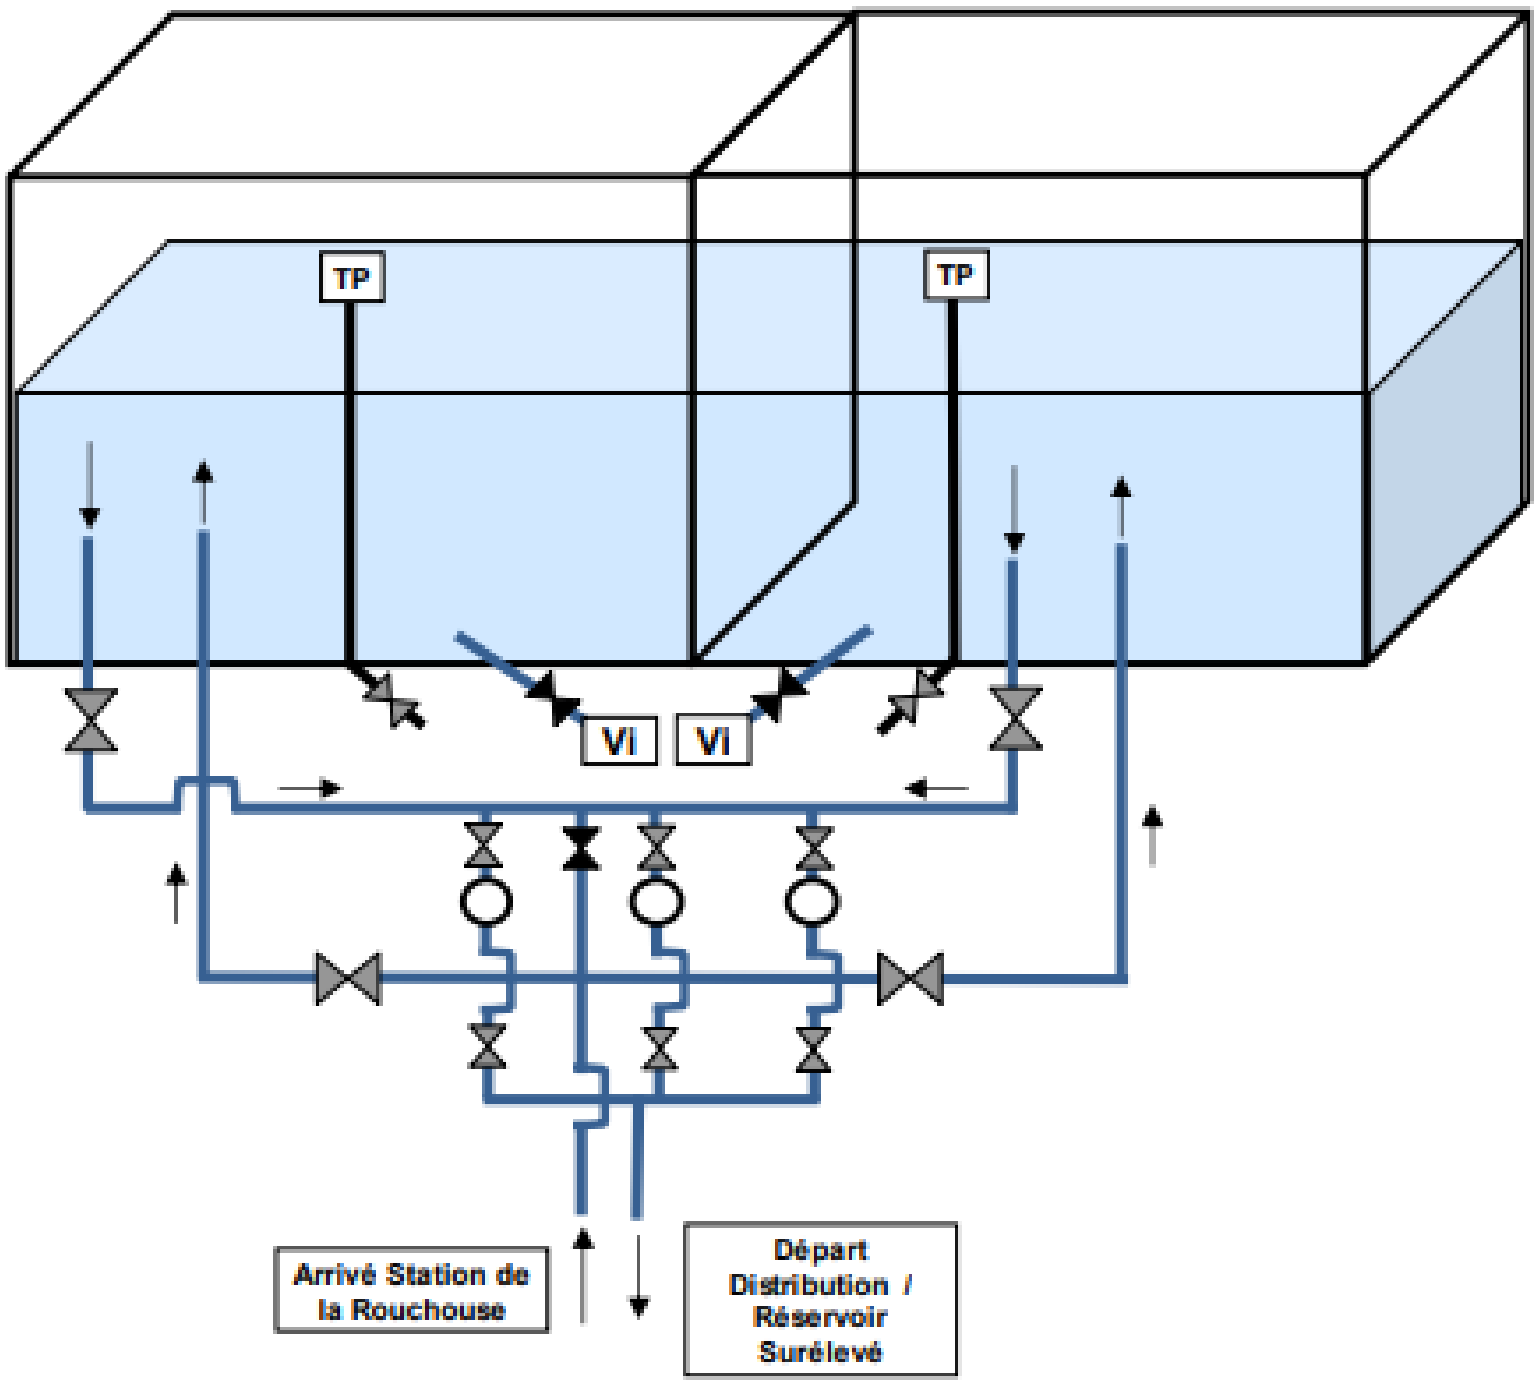

Légende

	Conduites	VI	Vidange
TP	Trop plein		Vanne fermée
	Pompes		Ventouse
	Vanne ouverte		Clapet anti-retour
	Ballon anti-bélier	C	Compteur

AR Prefecture
043-214302242-20250918-2025_09_01-DE
Reçu le 23/09/2025

FICHE OUVRAGE EAU POTABLE

Profil et cotes

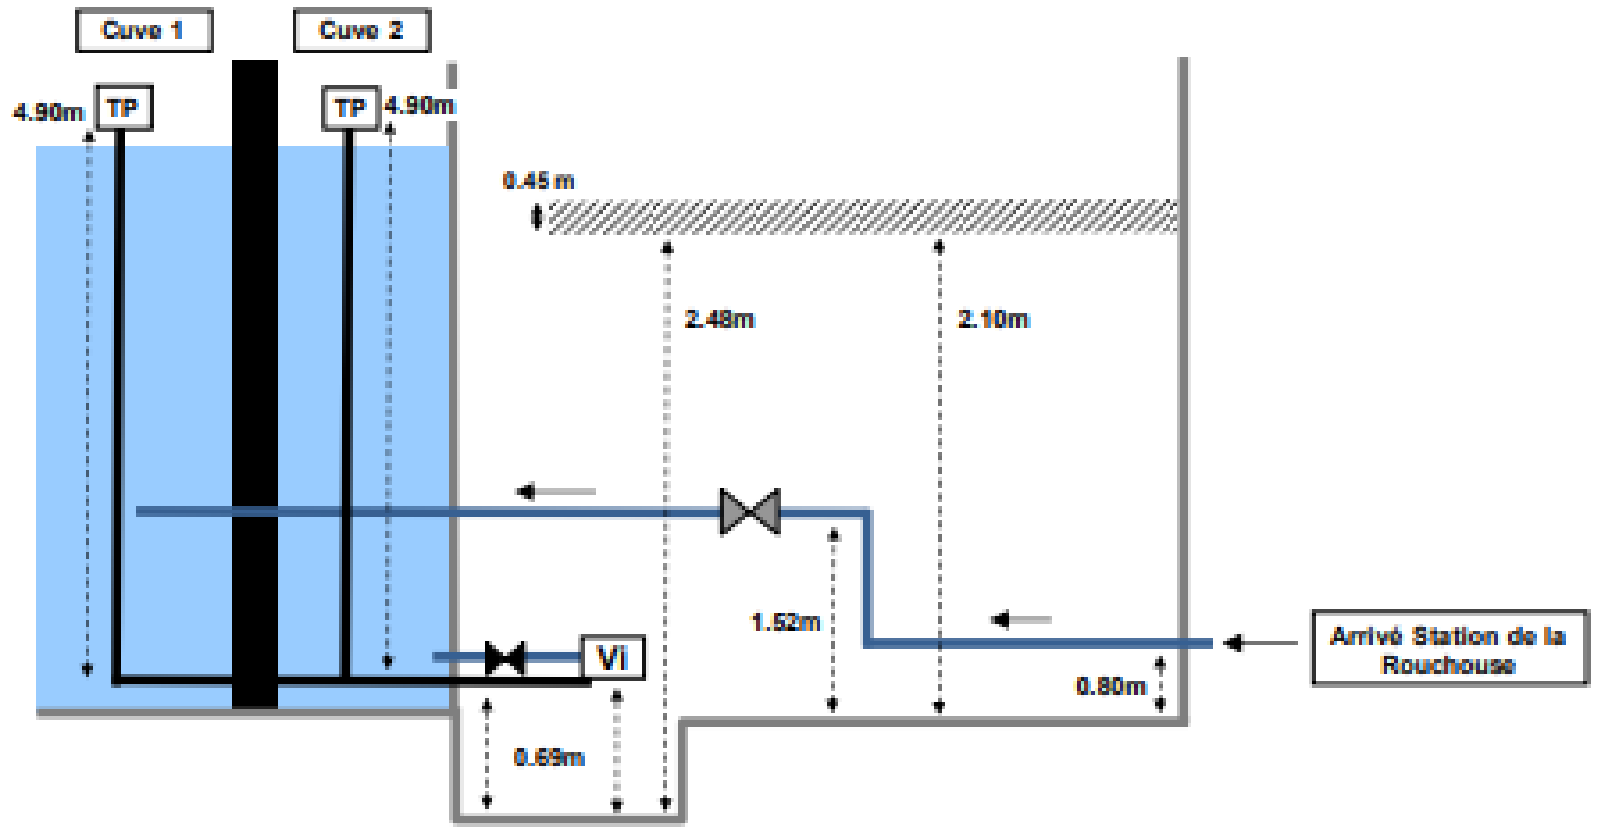

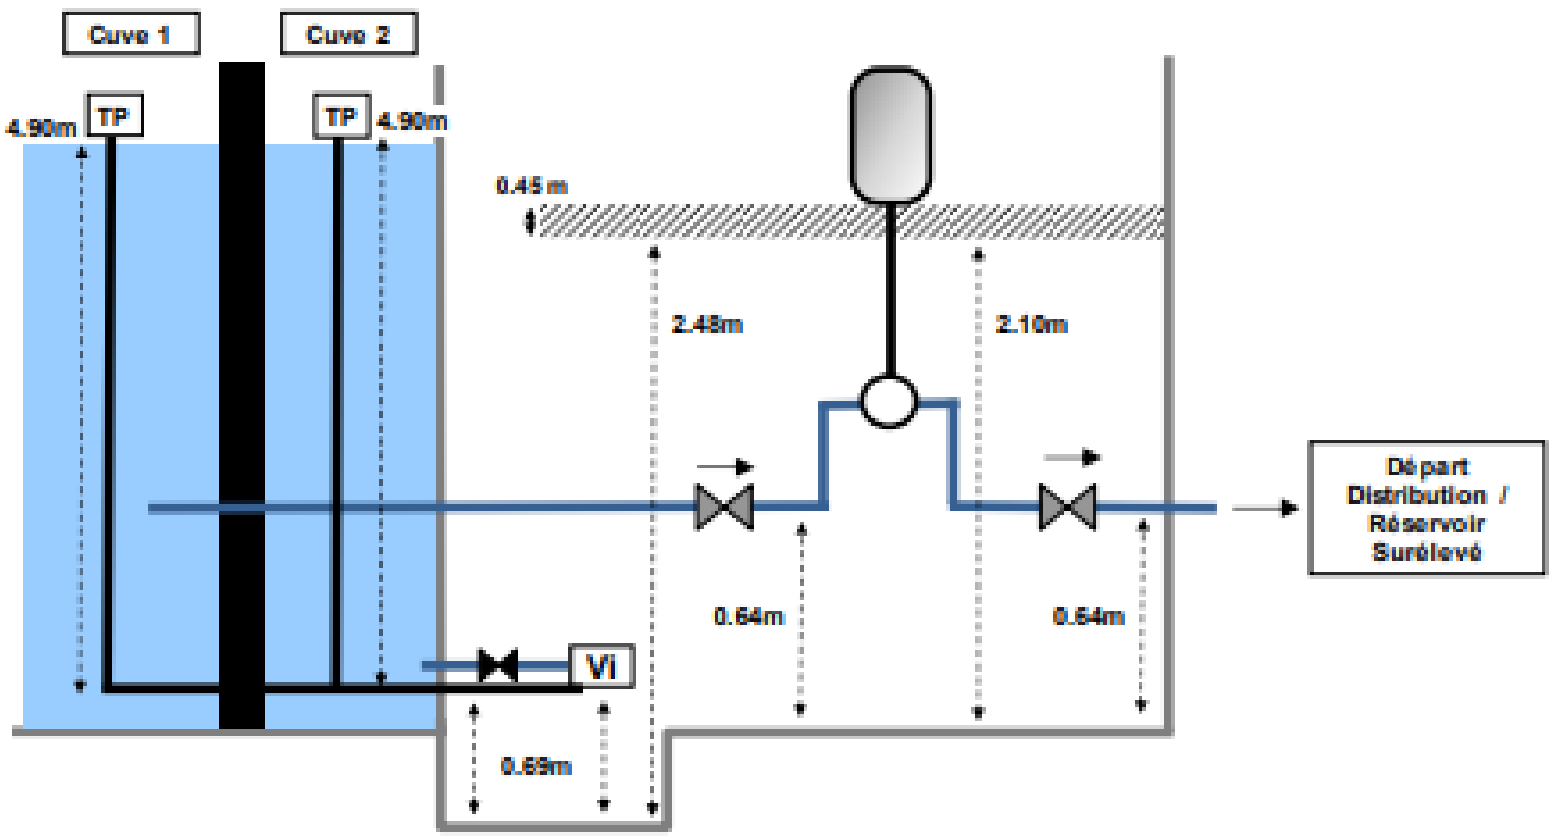

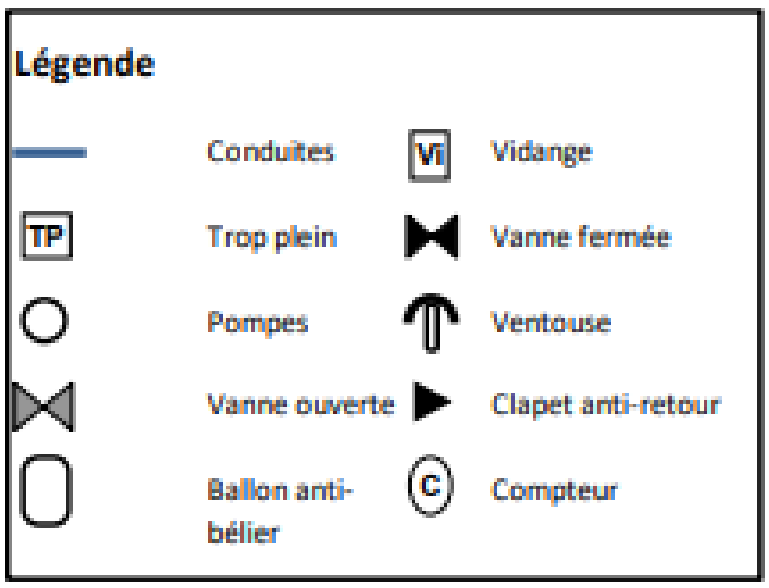

AR Prefecture
043-214302242-20250918-2025_09_01-DE
Reçu le 23/09/2025

altereo

Station de reprise ou de surpression

Sainte-sigolène

FICHE OUVRAGE EAU POTABLE

Identification

Nom usuel	Surpresseur les Paturaux	Plan de localisation
Commune d'implantation	Sainte Sigolène	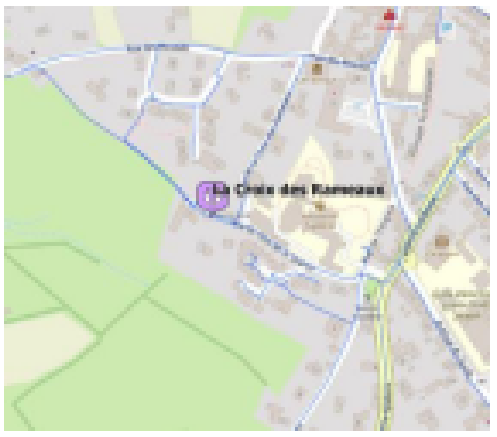
Lieux dit / adresse	Lot. Les Paturaux	
Commentaires		
Coordonnées IGN 69 RGF Lambert 93 - 2154	X : 798002.112	
	Y : 6462692.961	
	Z : 835.045 mNGF	

Généralités

Date de mise en service	-
Type de bâche d'aspiration	☐ Aérien ☐ Enterré ☒ Semi-enterré ☐ Posé au sol ☐ Inconnu ☐ Autre
Forme de la bâche	☐ Circulaire ☒ Rectangulaire ☐ Indéterminé ☐ Autres
Nombre de cuve	1 cuve
Volume (m3)	3.82
Cotes entrée/sortie	Entrée : 835.375 mNGF / Sortie : 835.375 mNGF
Cote trop plein	836.195 mNGF
Cote radier	835.045 mNGF
Cote sol	835.045 mNGF
Type d'alimentation	☐ Gravitaire robinet flotteur ☒ Gravitaire régulé ☐ Arrivée pompage ☐ Indéterminé ☐ Autre
Autonomie de stockage (h)	-
Réserve incendie	☐ Oui Volume de la réserve (m3) ☐ Non ☐ Non concerné ☒ Indéterminé
Temps de séjour (h)	Moyen : - / Pointe : -
Origine de l'eau	Coté NGF du départ : ☒ Réservoir ➔ Nom : Surélevé
Destination de l'eau	Coté NGF de l'arrivée : ☒ Distribution ➔ Nom : Lot. Les Paturaux

Caractéristiques des pompes

Nombre de pompes	2 Pompes
HMT	62 - 33
Marque/Modèle	Flygt
Age	-
Type pompage	☐ Surpresseur en ligne ☐ Pompage immergé ☒ Pompage aspiration ☐ Inconnu ☒ Autre
Etat	☒ Très bon état ☐ Présence des traces de vieillissement ☐ Dégradation généralisée ☐ Ne remplis plus sa fonction ☐ Inconnu
Débit nominal (m3/h)	6 - 14
Niveau de démarrage	-
Niveau d'arrêt	-
Puissance absorbée (KWh)	2.2
Variateur de fréquence	☐ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☒ Indéterminé
Temporisation marche	☐ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☒ Indéterminé
Temporisation arrêt	☐ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☒ Indéterminé

AR Prefecture
043-214302242-20250918-2025_09_01-DE
Reçu le 23/09/2025

FICHE OUVRAGE EAU POTABLE

Exploitation / Maintenance

Vidange et nettoyage	*Fréquence visite ouvrage*	☐ Quotidienne ☒ Hebdomadaire ☐ Mensuel ☐ Annuel ☐ Indéterminé ☐ Non concerné
	Fréquence vidange/nettoyage	☐ Hebdomadaire ☐ Mensuel ☒ Annuel ☐ Indéterminé ☐ Non concerné
	Fréquence entretiens espaces vert	☐ Hebdomadaire ☐ Mensuel ☒ Annuel ☐ Indéterminé ☐ Non concerné
Sécurité	*Produits dangereux à manipuler*	☐ Oui Type : ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
	Produits dangereux à manipuler fréquence	☐ Hebdomadaire ☐ Mensuel ☐ Annuel ☐ Indéterminé ☒ Non concerné
	Dispositif harnais	☐ Oui ☐ Non ☒ Non concerné ☐ Indéterminé
	Dispositif harnais conformité	☐ Oui ☐ Non ☒ Non concerné ☐ Indéterminé
Aération	*Aération basse*	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
	Aération haute	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
	Système antigel	☐ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☒ Indéterminé
Electricité	*Alimentation électrique*	☒ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
	Sécurité électrique	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
	Eclairage	☒ Electrique ☐ Naturel ☐ Non concerné ☐ Autre

Accès et protection du site

Voie d'accès	☐ Piétonnier ☐ Revêtue ☒ Voie carrossable VP ☐ Voie carrossable 4x4 ☐ Voie non carrossable ☐ Non accessible ☐ Non accessible ☐ Autre ☐ Inconnu
Présence portail	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Portail verrouillage	☐ Porte 2 battants ☐ Barrière mobile ☐ Volet roulant ☒ Non concerné ☐ Autre
Type de terrain	☒ Public ☐ Privé ☐ Indéterminé
Présence de clôture	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Panneau d'interdiction	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Présence de porte	☒ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Verrouillage porte	☒ Porte 1 point ☐ Porte 2 points ☐ Porte 3 points ☐ Non concerné ☐ Autre
Dispositif anti-intrusion	☐ Oui Type : Rapatriement de l'alarme : ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Fenêtres sécurisées	☐ Oui ☐ Non ☒ Non concerné ☐ Indéterminé
Sécurisation de l'accès à l'eau	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé

Génie civil

Etat global	☒ Correct ☐ Légèrement dégradé ☐ Fortement dégradé ☐ Inconnu
Désordre extérieur	☐ Micro fissure ☐ Fissure ☐ Lézarde ☐ Spectre d'armature ☐ Armature apparante ☐ Epaufrures ☐ Traces d'humidité ☐ Moisissures ☐ Autre
Etat extérieur bâti	☒ Correct ☐ Légèrement dégradé ☐ Fortement dégradé ☐ Inconnu
Désordre intérieur	☐ Micro fissure ☐ Fissure ☐ Lézarde ☐ Spectre d'armature ☐ Armature apparante ☐ Epaufrures ☒ Traces d'humidité ☒ Moisissures ☐ Autre
Etat intérieur bâti	☒ Correct ☐ Légèrement dégradé ☐ Fortement dégradé ☐ Inconnu
Etat équipements	☒ Très bon état ☐ Présence des traces de vieillissement ☐ Dégradation généralisée ☐ Ne remplis plus sa fonction ☐ Inconnu
Sécurité garde-corps	☐ Oui ☐ Non ☒ Non concerné ☐ Indéterminé
Sécurité échelle	☐ Oui ☐ Non ☒ Non concerné ☐ Indéterminé
Etat échelle	☐ Très bon état ☐ Présence des traces de vieillissement ☐ Dégradation généralisée ☐ Ne remplis plus sa fonction ☐ Inconnu

AR Prefecture
043-214302242-20250918-2025_09_01-DE
Reçu le 23/09/2025

Supervision/Equipements

Télégestion	☐ Oui	☒ Non	☐ Non concerné	☐ Indéterminé			
Modèle télégestion							
Télécommande	☐ Oui	☒ Non	☐ Non concerné	☐ Indéterminé			
Antenne télécom	☐ GSM	☐ RTC	☐ GPRS	☐ ADSL	☐ Radio	☐ Indéterminé	☐ Autre
Mode communication	☐ Oui	☐ Non	☐ Non concerné	☒ Indéterminé			
Poire de niveau	☐ Oui	☒ Non	☐ Non concerné	☐ Indéterminé			
Alarmes niveau	☐ Oui	☒ Non	☐ Non concerné	☐ Indéterminé			
Sonde de niveau	☒ Oui	☐ Non	☐ Non concerné	☐ Indéterminé			
Niveau télétransmission	☐ Oui	☐ Non	☐ Non concerné	☒ Indéterminé			

Suivi qualitatif/quantitatif

Suivi qualitatif	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé	
Suivi quantitatif	☒ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé	
Robinets de prélèvement	☒ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé	
Désinfection	***Désinfection***	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
	Type de désinfection	☐ Javel ☐ UV ☐ Chlore liquide régulé ☐ Chlore gazeux régulé ☐ Bioxyde ☐ Autre ☐ Inconnu
	Asservissement désinfection	☐ Oui ☐ Non ☒ Non concerné ☐ Indéterminé
	Point d'injection	☐ Cuve ☐ Départ distribution ☒ Non concerné ☐ Indéterminé ☐ Autre
	Stockage réactif	☒ Oui ☐ Non ☒ Non concerné ☐ Indéterminé
	Chloromètre	☒ Oui ☐ Non ☒ Non concerné ☐ Indéterminé

AR Prefecture
043-214302242-20250918-2025_09_01-DE
Reçu le 23/09/2025

FICHE OUVRAGE EAU POTABLE

Vue d'ensemble

Pompes

AR Prefecture
043-214302242-20250918-2025_09_01-DE
Reçu le 23/09/2025

Photos diverses

AR Prefecture
043-214302242-20250918-2025_09_01-DE
Reçu le 23/09/2025

Schéma de principe

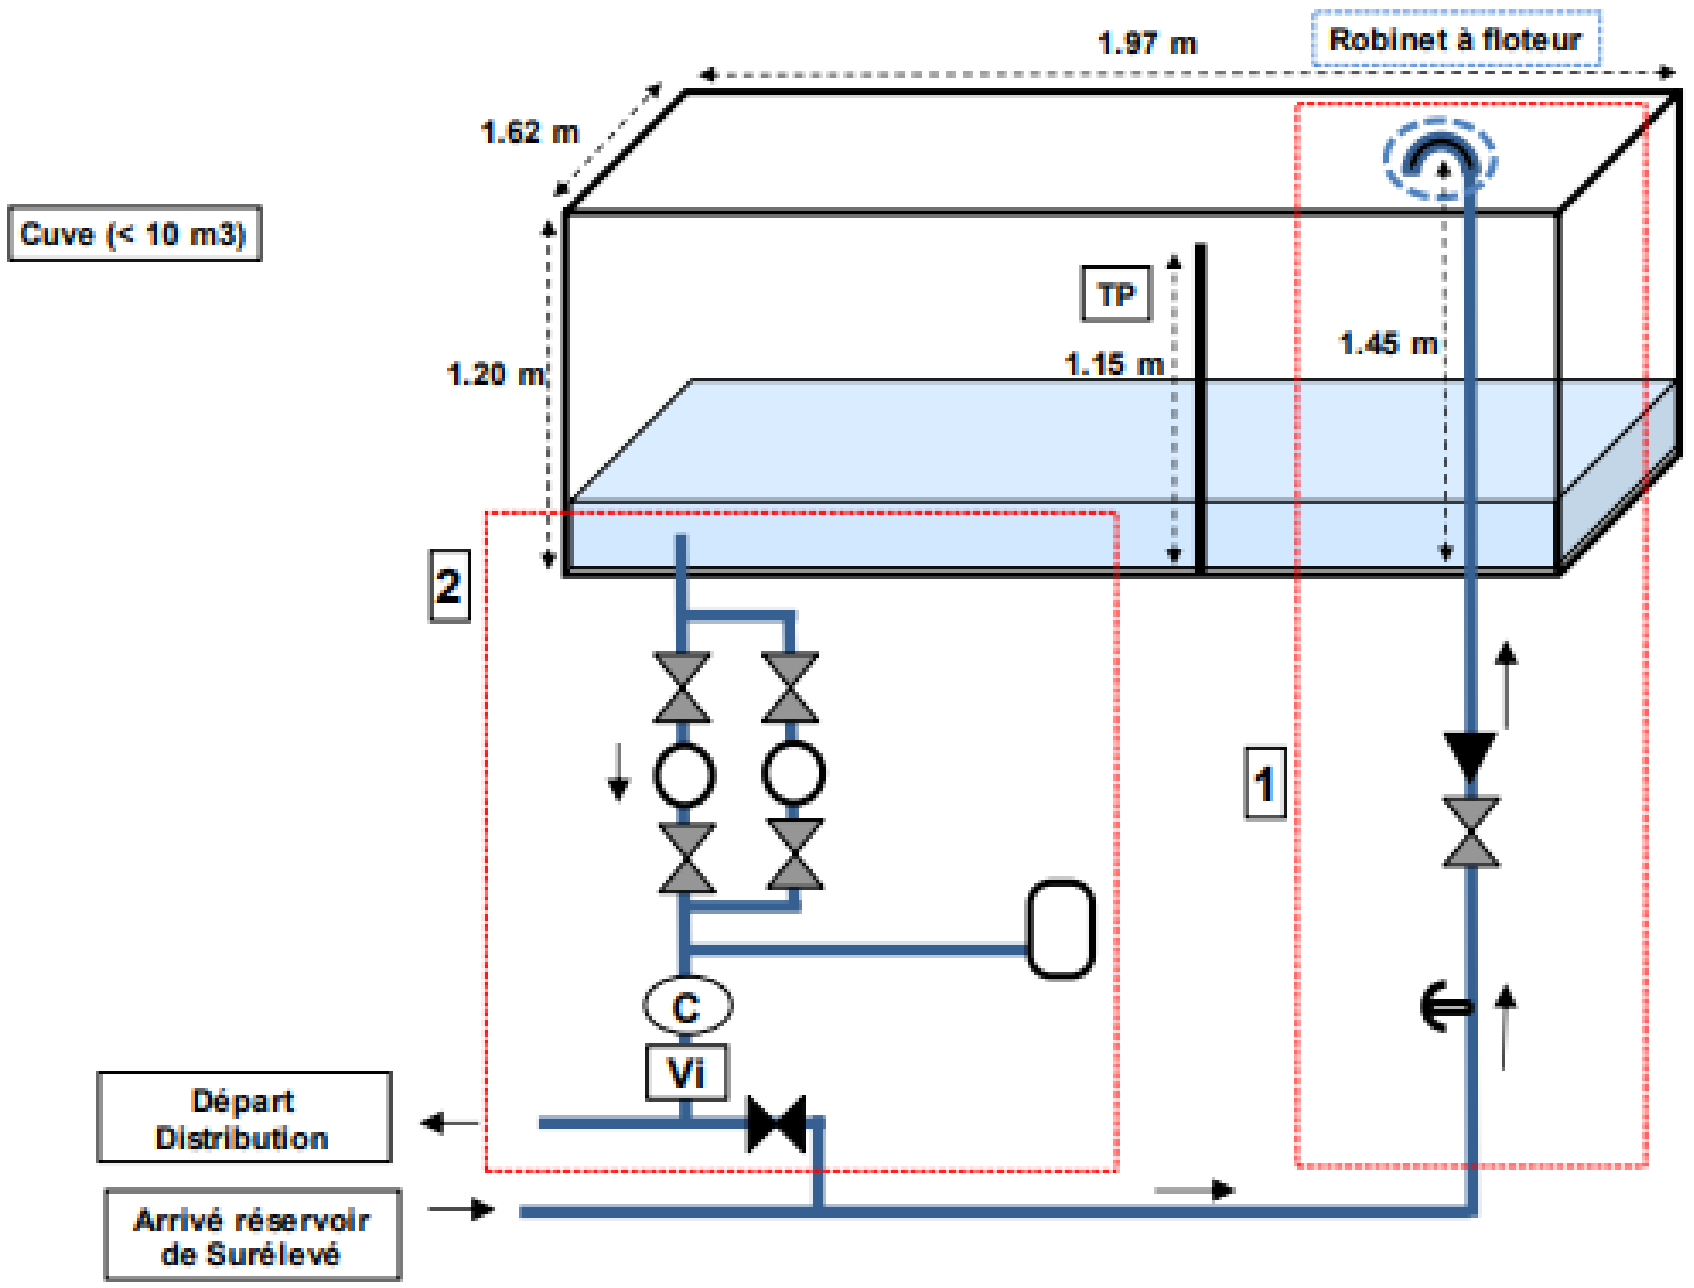

Légende

	Conduites	Vi	Vidange
TP	Trop plein		Vanne fermée
	Pompes		Ventouse
	Vanne ouverte		Clapet anti-retour
	Ballon anti-bélier	C	Compteur

AR Prefecture
043-214302242-20250918-2025_09_01-DE
Reçu le 23/09/2025

altereo

Station de reprise ou de surpression

Sainte-sigolène

FICHE OUVRAGE EAU POTABLE

Profil et cotes

1

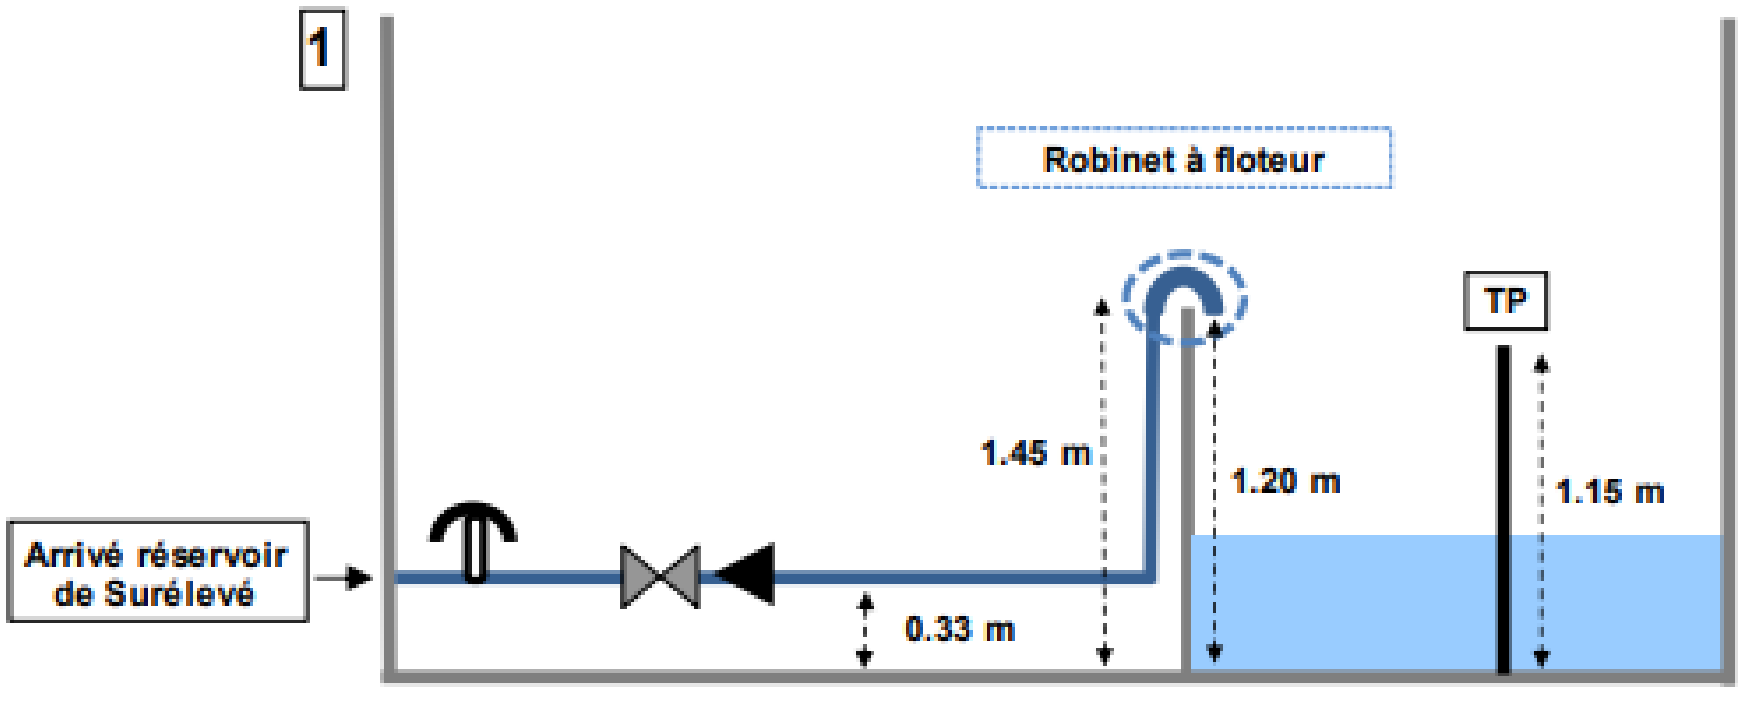

2

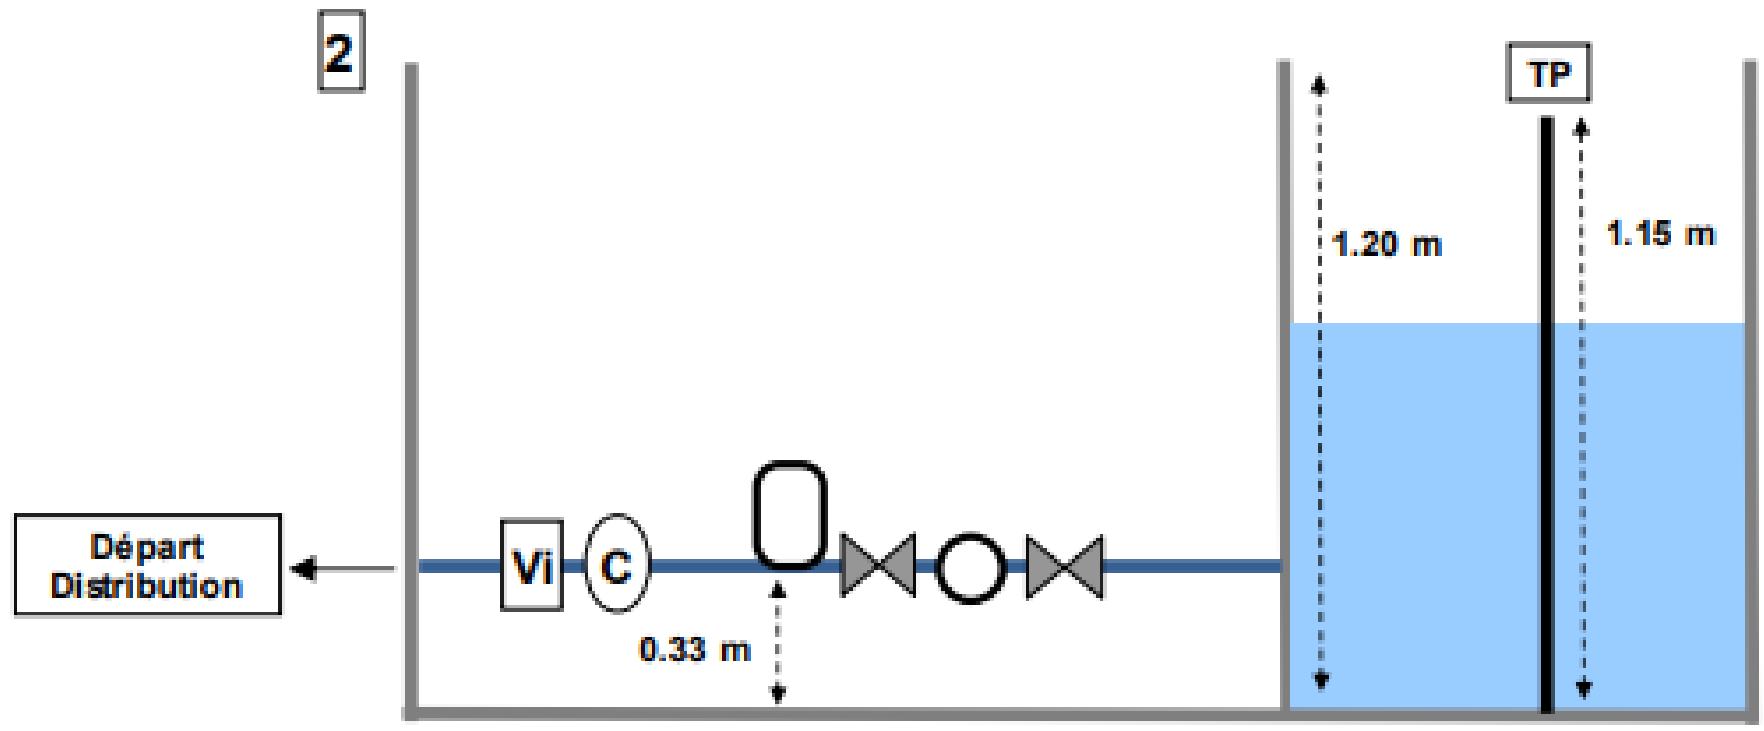

Légende

—	Conduites	Vi	Vidange
TP	Trop plein	⋈	Vanne fermée
○	Pompes	⏚	Ventouse
⋈	Vanne ouverte	▶	Clapet anti-retour
▯	Ballon anti-bélier	C	Compteur

AR Prefecture
043-214302242-20250918-2025_09_01-DE
Reçu le 23/09/2025

Surpresseur les Taillas

altereo

Station de reprise ou de surpression

Sainte-sigolène

FICHE OUVRAGE EAU POTABLE

Identification

Nom usuel	Surpresseur de la ZI des Taillas	**Plan de localisation**
Commune d'implantation	Sainte Sigolène	
Lieux dit / adresse	Zi des Taillas	
Commentaires	/	
Coordonnées IGN 69 RGF Lambert 93 - 2154	X : 798411.025	
	Y : 6462444.985	
	Z : 815.882 mNGF	

Généralités

Date de mise en service	
Nombre de cuve	Surpresseur en ligne / Pas de bâche ou cuve associée
Cotes entrée/sortie	Entrée : 814.762 mNGF / Sortie : 814.762 mNGF
Cote sol	815.882 mNGF
Type d'alimentation	☐ Gravitaire robinet flotteur ☒ Gravitaire régulé ☒ Arrivée pompage ☐ Indéterminé ☐ Autre
Origine de l'eau	Coté NGF du départ : ☒ Réservoir ➔ Nom : Surélevé
Destination de l'eau	Coté NGF de l'arrivée : ☒ Distribution ➔ Nom : Zi des Taillas

Caractéristiques des pompes

Nombre de pompes	2 Pompes
HMT	Pompe 1 : 34.3 / Pompe 2 : 31.6
Marque/Modèle	Movitec
Age	-
Type pompage	☒ Surpresseur en ligne ☐ Pompage immergé ☐ Pompage aspiration ☐ Inconnu ☐ Autre
Etat	☒ Très bon état ☐ Présence des traces de vieillissement ☐ Dégradation généralisée ☐ Ne remplis plus sa fonction ☐ Inconnu
Débit nominal (m3/h)	Pompe 1 : 32.4 / Pompes : 27
Niveau de démarrage	-
Niveau d'arrêt	-
Puissance absorbée (KWh)	Pompe 1 : 5.5 / Pompes : 4.0
Variateur de fréquence	☐ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☒ Indéterminé
Temporisation marche	☐ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☒ Indéterminé
Temporisation arrêt	☐ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☒ Indéterminé

AR Prefecture
043-214302242-20250918-2025_09_01-DE
Reçu le 23/09/2025

FICHE OUVRAGE EAU POTABLE

Vidange et nettoyage	*Fréquence visite ouvrage*	☐ Quotidienne ☒ Hebdomadaire ☐ Mensuel ☐ Annuel ☐ Indéterminé ☐ Non concerné
	Fréquence vidange/nettoyage	☐ Hebdomadaire ☐ Mensuel ☐ Annuel ☐ Indéterminé ☒ Non concerné
	Fréquence entretiens espaces vert	☐ Hebdomadaire ☐ Mensuel ☐ Annuel ☐ Indéterminé ☒ Non concerné
Sécurité	*Produits dangereux à manipuler*	☐ Oui Type : ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
	Produits dangereux à manipuler fréquence	☐ Hebdomadaire ☐ Mensuel ☐ Annuel ☐ Indéterminé ☒ Non concerné
	Dispositif harnais	☐ Oui ☐ Non ☒ Non concerné ☐ Indéterminé
	Dispositif harnais conformité	☐ Oui ☐ Non ☒ Non concerné ☐ Indéterminé
Aération	*Aération basse*	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
	Aération haute	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
	Système antigel	☐ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☒ Indéterminé
Electricité	*Alimentation électrique*	☒ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
	Sécurité électrique	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
	Eclairage	☒ Electrique ☐ Naturel ☐ Non concerné ☐ Autre

Accès et protection du site

Voie d'accès	☐ Piétonnier ☐ Revêtue ☒ Voie carrossable VP ☐ Voie carrossable 4x4 ☐ Voie non carrossable ☐ Non accessible ☐ Non accessible ☐ Autre ☐ Inconnu
Présence portail	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Portail verrouillage	☐ Porte 2 battants ☐ Barrière mobile ☐ Volet roulant ☒ Non concerné ☐ Autre
Type de terrain	☒ Public ☐ Privé ☐ Indéterminé
Présence de clôture	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Panneau d'interdiction	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Présence de porte	☒ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Verrouillage porte	☒ Porte 1 point ☐ Porte 2 points ☐ Porte 3 points ☐ Non concerné ☐ Autre
Dispositif anti-intrusion	☐ Oui Type : Rapatriement de l'alarme : ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Fenêtres sécurisées	☐ Oui ☐ Non ☒ Non concerné ☐ Indéterminé
Sécurisation de l'accès à l'eau	☐ Oui ☐ Non ☒ Non concerné ☐ Indéterminé

Génie civil

Etat global	☐ Correct ☒ Légèrement dégradé ☐ Fortement dégradé ☐ Inconnu
Désordre extérieur	☐ Micro fissure ☐ Fissure ☐ Lézarde ☐ Spectre d'armature ☐ Armature apparente ☐ Epaufrures ☐ Traces d'humidité ☐ Moisissures ☐ Autre
Etat extérieur bâti	☒ Correct ☐ Légèrement dégradé ☐ Fortement dégradé ☐ Inconnu
Désordre intérieur	☐ Micro fissure ☐ Fissure ☐ Lézarde ☐ Spectre d'armature ☐ Armature apparente ☒ Epaufrures ☐ Traces d'humidité ☐ Moisissures ☐ Autre
Etat intérieur bâti	☐ Correct ☒ Légèrement dégradé ☐ Fortement dégradé ☐ Inconnu
Etat équipements	☐ Très bon état ☒ Présence des traces de vieillissement ☐ Dégradation généralisée ☐ Ne remplis plus sa fonction ☐ Inconnu
Sécurité garde-corps	☐ Oui ☐ Non ☒ Non concerné ☐ Indéterminé
Sécurité échelle	☐ Oui ☐ Non ☒ Non concerné ☐ Indéterminé
Etat échelle	☐ Très bon état ☐ Présence des traces de vieillissement ☐ Dégradation généralisée ☐ Ne remplis plus sa fonction ☐ Inconnu

Supervision/Equipements

Télégestion	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé

AR Prefecture
043-214302242-20250918-2025_09_01-DE
Reçu le 23/09/2025

Modèle télégestion	
Télécommande	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Antenne télécom	☐ GSM ☐ RTC ☐ GPRS ☐ ADSL ☐ Radio ☒ Indéterminé ☐ Autre
Mode communication	☐ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☒ Indéterminé
Poire de niveau	☐ Oui ☐ Non ☒ Non concerné ☐ Indéterminé
Alarmes niveau	☐ Oui ☐ Non ☒ Non concerné ☐ Indéterminé
Sonde de niveau	☐ Oui ☐ Non ☒ Non concerné ☐ Indéterminé
Niveau télétransmission	☐ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☒ Indéterminé

Suivi qualitatif/quantitatif

Suivi qualitatif		☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Suivi quantitatif		☒ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Robinets de prélèvement		☒ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Désinfection	***Désinfection***	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
	Type de désinfection	☐ Javel ☐ UV ☐ Chlore liquide régulé ☐ Chlore gazeux régulé ☐ Bioxyde ☐ Autre ☐ Inconnu
	Asservissement désinfection	☐ Oui ☐ Non ☒ Non concerné ☐ Indéterminé
	Point d'injection	☐ Cuve ☐ Départ distribution ☒ Non concerné ☐ Indéterminé ☐ Autre
	Stockage réactif	☐ Oui ☐ Non ☒ Non concerné ☐ Indéterminé
	Chloromètre	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé

AR Prefecture
043-214302242-20250918-2025_09_01-DE
Reçu le 23/09/2025

FICHE OUVRAGE EAU POTABLE

Photos

Vue d'ensemble

Pompes

AR Prefecture
043-214302242-20250918-2025_09_01-DE
Reçu le 23/09/2025

FICHE OUVRAGE EAU POTABLE

Photos diverses

AR Prefecture
043-214302242-20250918-2025_09_01-DE
Reçu le 23/09/2025

FICHE OUVRAGE EAU POTABLE

Schéma de principe

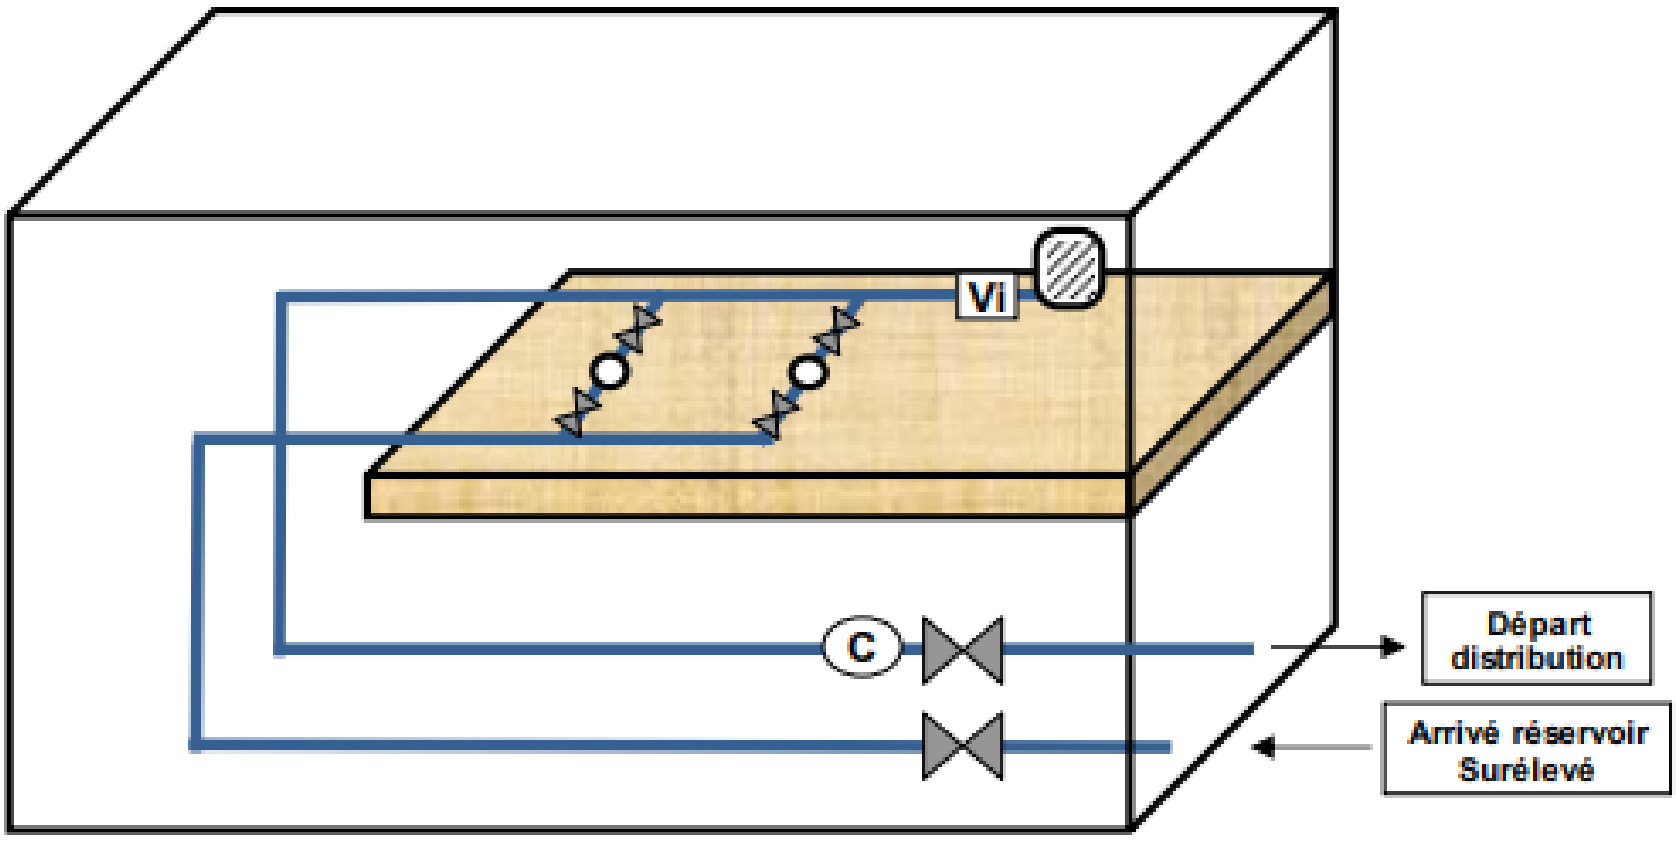

Légende

	Conduites	Vi	Vidange
TP	Trop plein		Vanne fermée
	Pompes		Ventouse
	Vanne ouverte		Clapet anti-retour
	Ballon anti-bélier	C	Compteur

AR Prefecture
043-214302242-20250918-2025_09_01-DE
Reçu le 23/09/2025

Profil et cotes

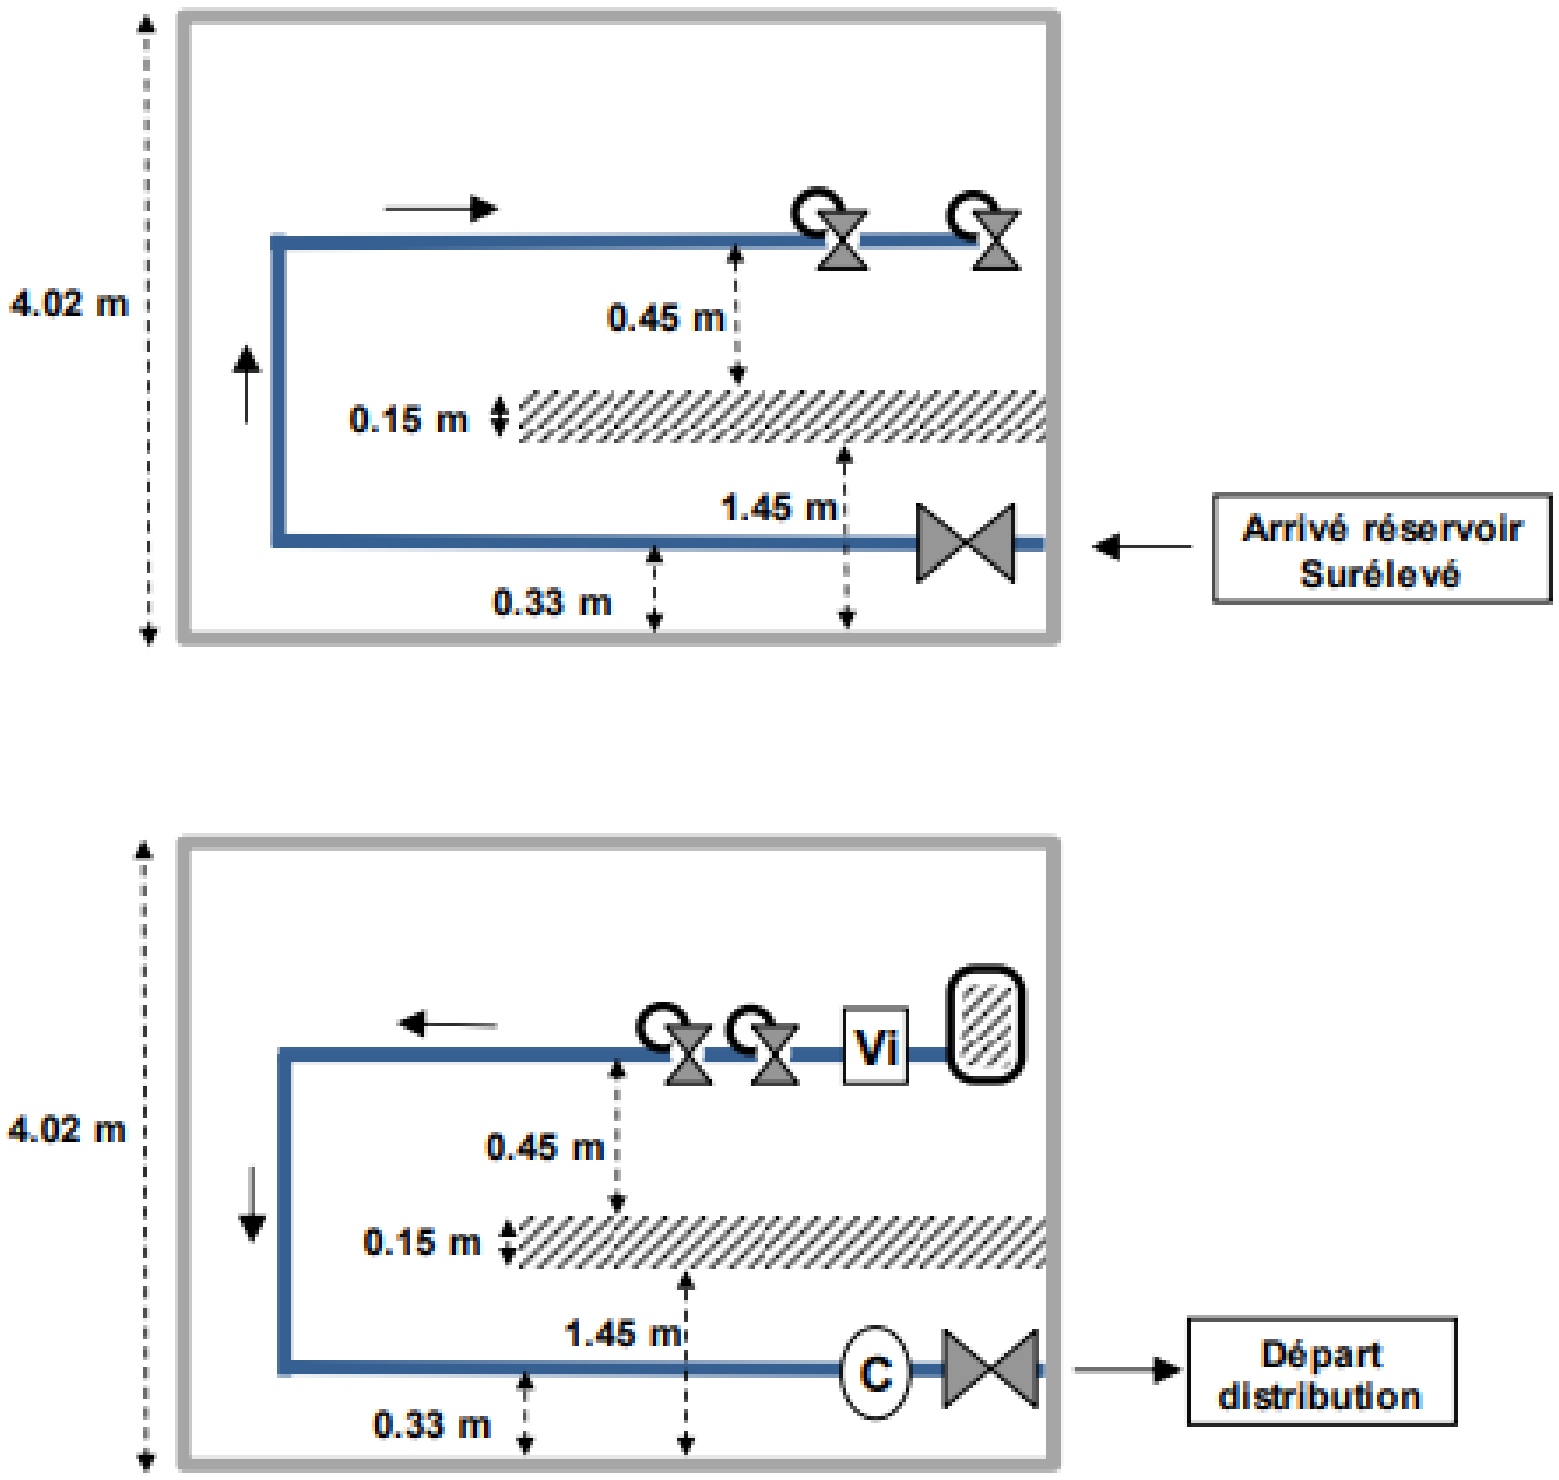

Légende

	Conduites	Vi	Vidange
TP	Trop plein		Vanne fermée
	Pompes		Ventouse
	Vanne ouverte		Clapet anti-retour
	Ballon anti-bélier	C	Compteur

AR Prefecture
043-214302242-20250918-2025_09_01-DE
Reçu le 23/09/2025

4. Les réservoirs

Nom	Lieu-dit	Type	Origine de l'eau	Destination de l'eau	Cote radier (mNGF)	Cote trop plein (mNGF)	Capacité théorique (m^3)
Station de pompage de La Rouchouse	La Rouchouse	Semi-enterré	Réservoir	Station de pompage La Croix des Rameaux	680.21	682.42	1 000
Station de pompage La Croix des Rameaux	Ste-Sigolène	Semi-enterré	Station de pompage de La Rouchouse	Réservoir Surélevé / Distribution	807,58	810	500
Réservoir Surélevé	Ste-Sigolène	Aérien	Station de pompage La Croix des Rameaux	Distribution	837.30	852.47	679
Surpresseur du Lotissement des Paturaux	Ste-Sigolène	Semi-enterré	Réservoir Surélevé	Distribution	826.23	827.43	4

AR Prefecture
043-214302242-20250918-2025_09_01-DE
Reçu le 23/09/2025

Ouvrage de stockage

FICHE OUVRAGE EAU POTABLE

Identification

Nom usuel	Surélevé Sainte Sigolène	**Plan de localisation**
Commune d'implantation	Sainte Sigolène	
Lieux dit / adresse	1 Rte de la Pontchardière, 43600 Sainte-Sigolène	
Commentaires	/	
Coordonnées IGN 69 RGF Lambert 93 - 2154	X : 797128.212 Y : 6462157.139 Z : 837.348 mNGF	

Généralités

Date de mise en service	-
Type	☒ Aérien ☐ Enterré ☐ Semi-enterré ☐ Posé au sol ☐ Inconnu ☐ Autre
Forme	☒ Circulaire ☐ Rectangulaire ☐ Indéterminé ☐ Autre
Nombre de cuve	1 Cuve
Volume (m3)	679
Etat extérieur bâti	☒ Correct ☐ Légèrement dégradé ☐ Fortement dégradé ☐ Inconnu
Entretien espaces verts :	☒ Correct ☐A améliorer ☐ Terrain en friche ☐ Présence d'arbres/Arbustes à proximité
Cuve	
Dimensions de la cuve :	/
Cotes entrée/sortie	Entrée : 837.348 mNGF / Sortie : 837.348 mNGF
Cote trop plein	852.598 mNGF
Cote radier	846.598 mNGF
Cote sol	837.348 mNGF
Type d'alimentation	☐ Gravitaire robinet flotteur ☐ Gravitaire régulé ☒ Arrivée pompage ☐ Indéterminé ☐ Autre
Autonomie de stockage (h)	/
Réserve incendie	☐ Oui Volume de la réserve (m3): ☐ Non ☐ Non concerné ☒ Indéterminé
Temps de séjour (h)	Moyen : - / Pointe:// -
Origine de l'eau	Cote NGF de l'arrivée : ☒ Station de pompage ➔ Nom : La Croix des Rameaux
Destination de l'eau	Cote NGF du départ : ☒ Distribution

AR Prefecture
043-214302242-20250918-2025_09_01-DE
Reçu le 23/09/2025

altereo

Ouvrage de stockage

Sainte-Sigolène

FICHE OUVRAGE EAU POTABLE

Exploitation / Maintenance

Entretiens et Nettoyage	***Fréquence visite ouvrage***	☒ Hebdomadaire ☐ Mensuel ☐ Annuel ☐ Indéterminé ☐ Non concerné
	Fréquence vidange/nettoyage	☐ Hebdomadaire ☐ Mensuel ☒ Annuel ☐ Indéterminé ☐ Non concerné
	Fréquence entretiens espaces vert	☐ Hebdomadaire ☐ Mensuel ☒ Annuel ☐ Indéterminé ☐ Non concerné
Sécurité	***Produits dangereux à manipuler***	☐ Oui Type : ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
	Produits dangereux à manipuler fréquence	☐ Hebdomadaire ☐ Mensuel ☐ Annuel ☐ Indéterminé ☒ Non concerné
	Dispositif harnais	☐ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☒ Indéterminé
	Dispositif harnais conformité	☐ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☒ Indéterminé
Aération	***Aération basse***	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
	Aération haute	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
	Aération état	☐ Très bon état ☐ Présence des traces de vieillissement ☐ Dégradation généralisée ☐ Ne remplis plus sa fonction ☒ Inconnu
Electricité	***Alimentation élec***	☒ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
	Sécurité élec (groupe élec, etc.)	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
	Eclairage	☒ Electrique ☐ Naturel ☐ Non concerné ☐ Autre

Accès et protection du site

Voie d'accès	☐ Piétonnier ☐ Revêtue ☒ Voie carrossable VP ☐ Voie carrossable 4x4 ☐ Voie non carrossable ☐ Non accessible ☐ Non accessible ☐ Autre ☐ Inconnu
Présence portail	☒ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Portail verrouillage	☒ Porte 2 battants ☐ Barrière mobile ☐ Volet roulant ☐ Non concerné ☐ Autre
Type de terrain	☐ Public ☒ Privé ☐ Indéterminé
Présence de clôture	☒ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Panneau d'interdiction	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Présence de porte	☒ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Verrouillage porte	☒ Porte 1 point ☐ Porte 2 points ☐ Porte 3 points ☐ Non concerné ☐ Autre
Dispositif anti-intrusion	☒ Oui Type : Rapatriement de l'alarme : ☐ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Fenêtres sécurisées	☐ Oui ☐ Non ☒ Non concerné ☐ Indéterminé
Sécurisation de l'accès à l'eau	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé

Génie civil

Etat global	☒ Correct ☐ Légèrement dégradé ☐ Fortement dégradé ☐ Inconnu
Désordre extérieur	☐ Micro fissure ☐ Fissure ☐ Lézarde ☐ Spectre d'armature ☐ Armature apparante ☐ Epaufrures ☐ Traces d'humidité ☐ Moisissures ☐ Autre
Etat extérieur bâti	☒ Correct ☐ Légèrement dégradé ☐ Fortement dégradé ☐ Inconnu
Désordre intérieur	☐ Micro fissure ☐ Fissure ☐ Lézarde ☐ Spectre d'armature ☐ Armature apparante ☐ Epaufrures ☐ Traces d'humidité ☐ Moisissures ☐ Autre
Etat intérieur bâti	☒ Correct ☐ Légèrement dégradé ☐ Fortement dégradé ☐ Inconnu
Etat équipements	☐ Très bon état ☒ Présence des traces de vieillissement ☐ Dégradation généralisée ☐ Ne remplis plus sa fonction ☐ Inconnu
Sécurité garde-corps	☒ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Etat garde-corps	☒ Très bon état ☐ Présence des traces de vieillissement ☐ Dégradation généralisée ☐ Ne remplis plus sa fonction ☐ Inconnu
Sécurité échelle	☒ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Etat échelle	☒ Très bon état ☐ Présence des traces de vieillissement ☐ Dégradation généralisée ☐ Ne remplis plus sa fonction ☐ Inconnu

AR Prefecture
043-214302242-20250918-2025_09_01-DE
Reçu le 23/09/2025

Ouvrage de stockage

FICHE OUVRAGE EAU POTABLE

Supervision/Equipements

Télégestion	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Modèle télégestion	Sofrel
Télécommande	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Antenne télécom	☐ GSM ☐ RTC ☐ GPRS ☐ ADSL ☐ Radio ☒ Indéterminé ☐ Autre
Mode communication	☒ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Poire de niveau	☒ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Alarmes niveau	☒ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Sonde de niveau	☒ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Niveau télétransmission	☐ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☒ Indéterminé
Dispositif pour la qualité de l'air	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé

Suivi qualitatif/quantitatif

Suivi qualitatif		☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Suivi quantitatif		☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Robinets de prélèvement		☐ Oui ☐ Non ☐ Non concerné ☒ Indéterminé
Désinfection	***Désinfection***	☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
	Type de désinfection	☐ Javel ☐ UV ☐ Chlore liquide régulé ☐ Chlore gazeux régulé ☐ Bioxyde ☐ Autre ☐ Inconnu
	Asservissement désinfection	☐ Oui ☐ Non ☒ Non concerné ☐ Indéterminé
	Point d'injection	☐ Cuve ☐ Départ distribution ☒ Non concerné ☐ Indéterminé ☐ Autre
	Stockage réactif	☐ Oui ☐ Non ☒ Non concerné ☐ Indéterminé
	Chloromètre	☐ Oui ☐ Non ☒ Non concerné ☐ Indéterminé
Turbidimètre		☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Mélange d'eau		☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Sonde de température		☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Autocontrôle		☐ Oui ☒ Non ☐ Non concerné ☐ Indéterminé
Commentaires		Une seule désinfection au niveau de la station de pompage de la Rouchouse

Remarques

- Les matériaux d'isolations des conduites présentes des traces de vieillissements.
- La conduite d'adduction arrivant dans le réservoir à des traces de rouille. Attention qualité sanitaire.
- Pas de sécurité (point d'ancrage harnais, etc.) au niveau de l'échelle permettant d'accéder à la cuve.

AR Prefecture
043-214302242-20250918-2025_09_01-DE
Reçu le 23/09/2025

altereo

Ouvrage de stockage

Sainte-Sigolène

FICHE OUVRAGE EAU POTABLE

Photos

Vue d'ensemble

Photos intérieures

Chambre de vannes

Cuve

AR Prefecture
043-214302242-20250918-2025_09_01-DE
Reçu le 23/09/2025

FICHE OUVRAGE EAU POTABLE

Schéma de principe

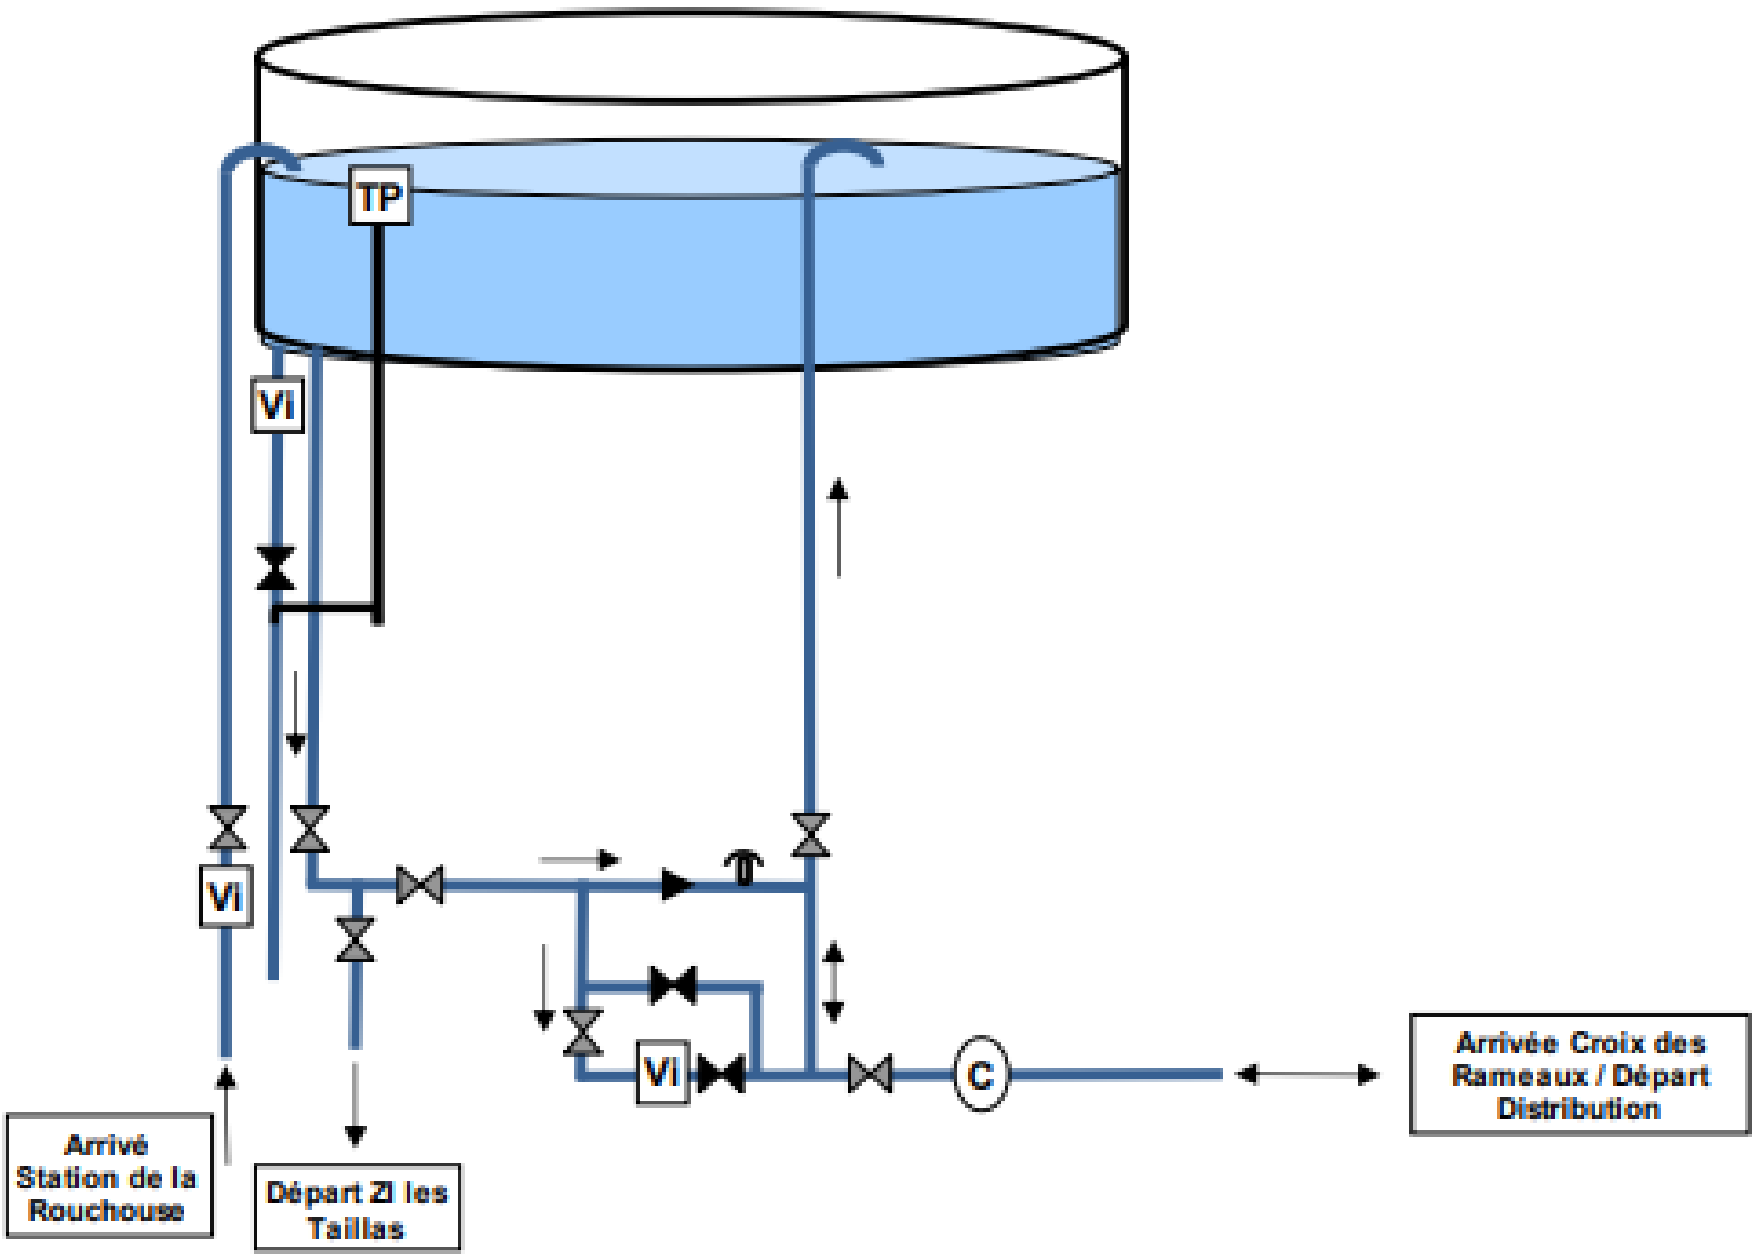

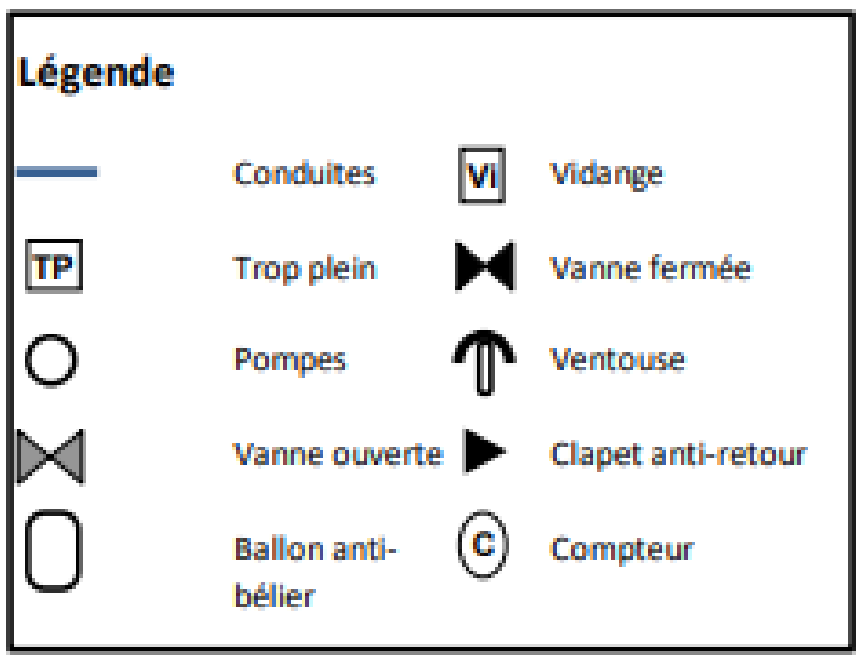

AR Prefecture
043-214302242-20250918-2025_09_01-DE
Reçu le 23/09/2025

FICHE OUVRAGE EAU POTABLE

Profil et cotes

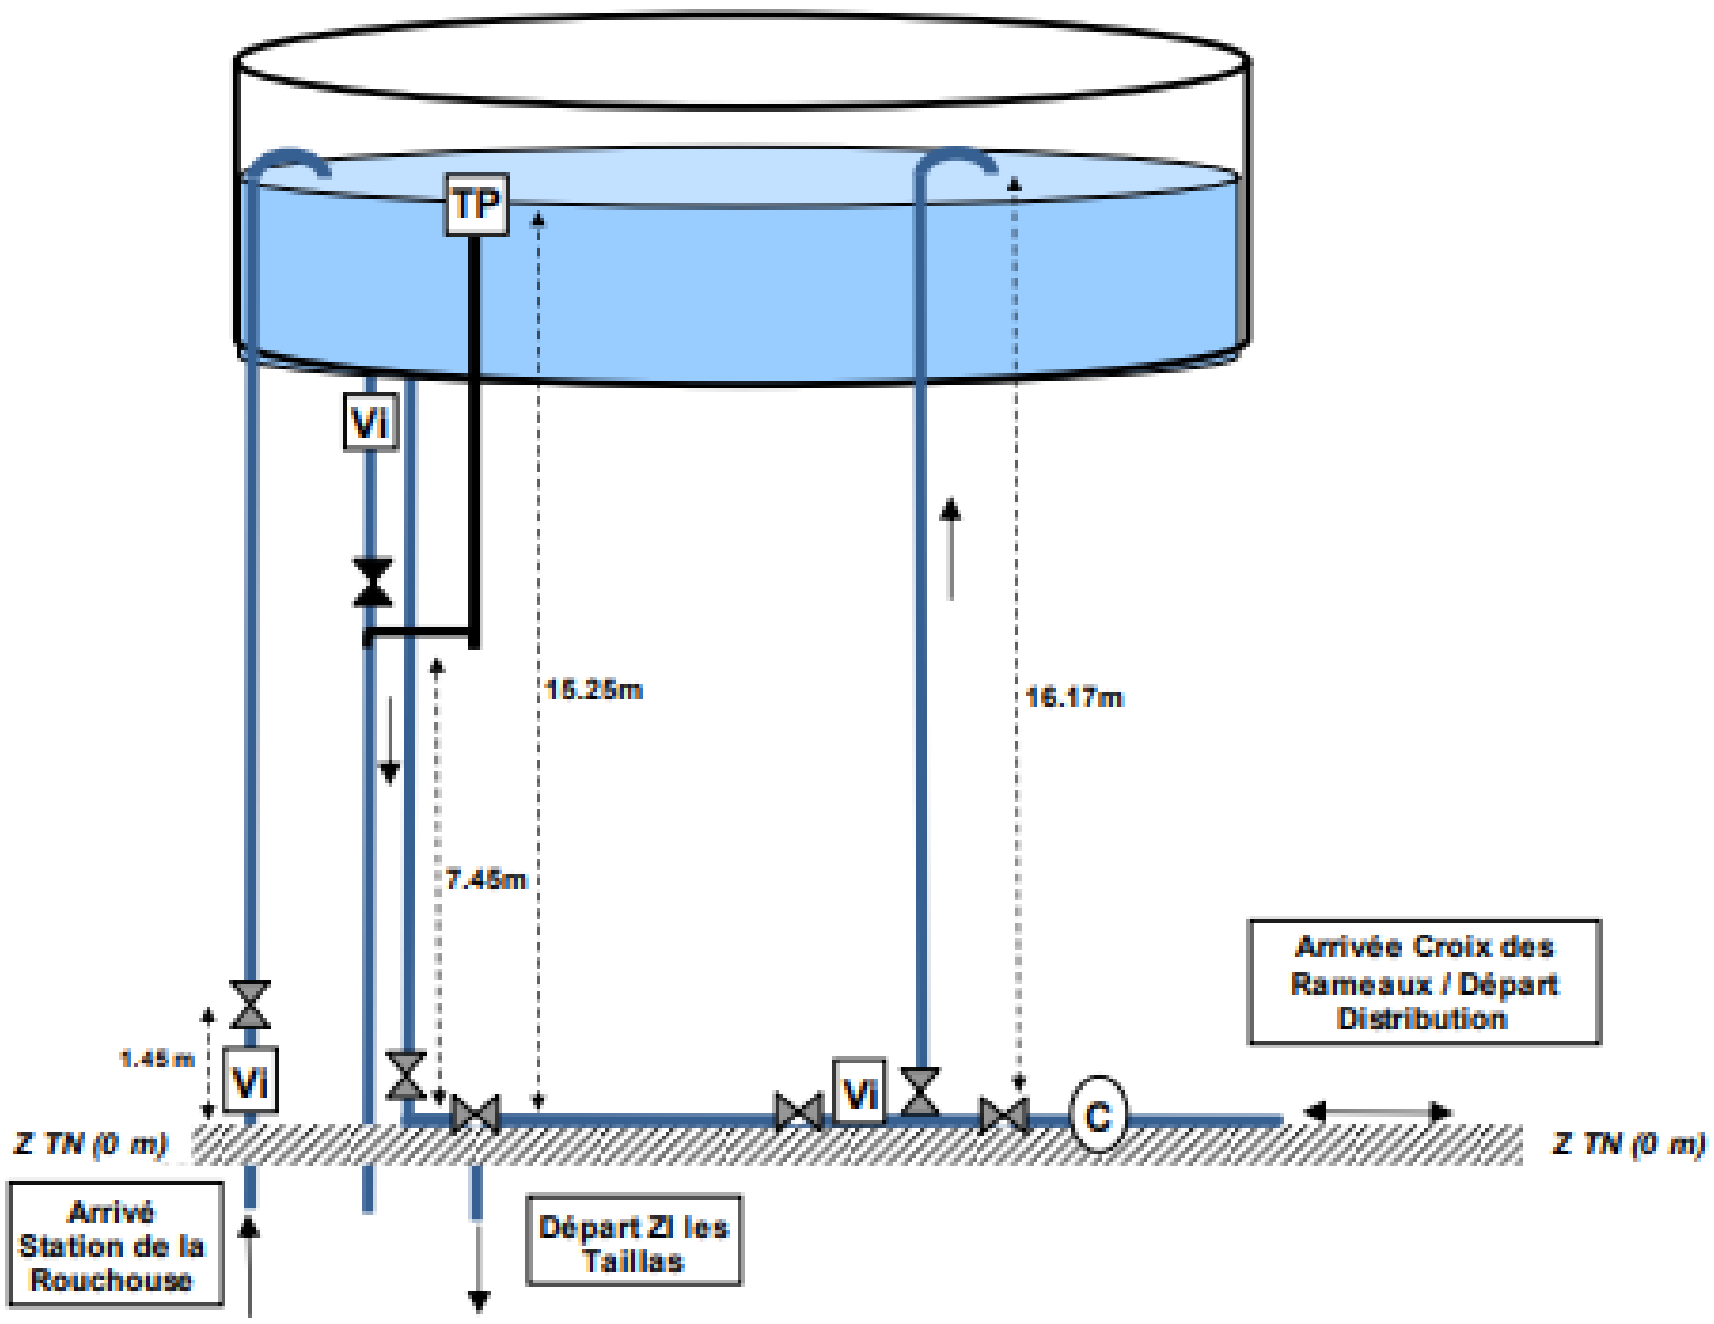

Légende

	Conduites	VI	Vidange
TP	Trop plein		Vanne fermée
	Pompes		Ventouse
	Vanne ouverte		Clapet anti-retour
	Ballon anti-bélier	C	Compteur

AR Prefecture
043-214302242-20250918-2025_09_01-DE
Reçu le 23/09/2025

5. Etat des ouvrages de stockage et pompage

	Ouvrages	Station de pompage de la Rouchouse	Station de pompage de la Croix des Rameaux	Réservoir Surélevé
	Identité photographique			
Vulnérabilité du site	Site préjudiciable à l'ouvrage	✅	✅	✅
	Présence d'alarme anti-intrusion	❌	❌	❌
	Présence de délimitation (clôture et/ou portail)	✅	✅	✅
Etat structurel	*L'ouvrage nécessite-t-il des travaux de réparation structurale ? (OUI / NON)*	OUI	NON	NON
	Les défauts relevés mettent-ils en cause l'étanchéité de l'ouvrage ? (OUI / NON)	OUI	NON	NON
Etat intérieur des cuves	*Visites faites avec cuves remplies*	Pas de constats sur état intérieur des cuves		
Etat des équipements hydrauliques	***Bon état*** / ***Moyen*** / ***Mauvais***	✖	✖	✖
Conditions d'exploitation	*Présence de télégestion*	✅	✅	✅
	Présence d'une alimentation électrique	✅	✅	✅

	Ouvrages	Surpresseur Lot. les Paturaux	Surpresseur ZI des Taillas
	Identité photographique		
Vulnérabilité du site	Site préjudiciable à l'ouvrage	✅	✅
	Présence d'alarme anti-intrusion	❌	❌
	Présence de délimitation (clôture et/ou portail)	❌	❌
Etat structurel	*L'ouvrage nécessite-t-il des travaux de réparation structurale ? (OUI / NON)*	NON	NON
	Les défauts relevés mettent-ils en cause l'étanchéité de l'ouvrage ? (OUI / NON)	NON	NON
Etat intérieur des cuves	*Visites faites avec cuves remplies*	BON	PAS DE CUVES
Etat des équipements hydrauliques	***Bon état*** / ***Moyen*** / ***Mauvais***	✅	✅
Conditions d'exploitation	*Présence de télégestion*	❌	❌
	Présence d'une alimentation électrique	✅	✅
	Voie d'accès (carrossable / non carrossable)	Voie carrossable	Voie carrossable
	Moyens permanents d'accès et de sécurité	✅	✅

AR Prefecture
043-214302242-20250918-2025_09_01-DE
Reçu le 23/09/2025

6. Les compteurs généraux

Compteur	Adresse	Année de pose du compteur	Marque du compteur	Diamètre du compteur
Cpt-001-	Route de Firminy à Mende	1997	510PR	DN75
Cpt-002-	Station de pompage la Rouchouse	2018	Flotsar M	DN150
Cpt-003-	Route du Pinet	2008	Woltex M	DN100
Cpt-004-	Chemin de la Tuilerie	2020	Flotsar M	DN50
Cpt-005-	Route des Bachats, Carrefour Market	2020	Flotsar M	DN65
Cpt-006-	Route de Vérines	2015	Sensus	DN50
Cpt-007-	Chemin de la Bâtie	2008	Woltex M	DN100
Cpt-008-	Route de Jarnioux	2010	Woltex M	DN100
Cpt-009-	Lotissement Les Chênes	2008	Woltex M	DN100
Cpt-010-	Zone Industrielle Campine, Interconnexion vers Saint Pal de Mont	1985	Woltex M	DN100
Cpt-011-	Zone Industrielle Campine, Interconnexion de Saint Pal de Mont	1985	Woltex M	DN100
Cpt-012-	Rue de la Gendarmerie	2008	Woltex M	DN100
Cpt-013-	Chemin de l'Aulanière	2008	Woltex M	DN50
Cpt-014-	D44, vers Route de Reveyrolles	2008	Woltex M	DN100
Cpt-015-	Chemin des Navettes	2008	Woltex M	DN100
Cpt-016-	Rue des Erables	2012	Flotsar M	DN100
Cpt-017-	Route du Mont	2008	Woltex M	DN100
Cpt-018-	Débitmètre au réservoir Surélevé, direction ZI les Taillas	2009	ABB	DN150
Cpt-019-	Route du Bois de Fruges	2008	Woltex M	DN50
Cpt-020-	D43, Sainte Sigolène la Guide	2008	Woltex M	DN65
Cpt-021-	Route de la Roche des Tailles	2008	Woltex M	DN100
Cpt-022-	Route d'Yssingeaux	2009	Woltex M	DN65
Cpt-023-	Station de pompage de la Rouchouse, interconnexion avec les Villettes	2010	Zenner	DN50
Cpt-024-	Surpresseur ZI des Taillas	2008	Woltex M	DN80

AR Prefecture
043-214302242-20250918-2025_09_01-DE
Reçu le 23/09/2025

7. Les ouvrages de régulation

N° Appareillage	Diamètre	P amont (bars)	P aval (bars)	Etat de fonctionnement	Equipable	Accessibilité	Commentaires
19-Re-012	-	-	-	-	-	-	Il n'y plus de réducteur
19-Re-001	DN60	-	-	Inconnu	Autre	Domaine prive	-
19-Re-010	DN60	-	-	HS	Non	Accessibile	HS
19-Re-017	DN110	4.5	4.5	Très bon état	Oui	Accessibile	-
19-Re-002	DN110	-	-	Inconnu	Autre	Bloque	Bloquer par un film plastique/Inaccessible
19-Re-016	DN60	8.4	4.2	Très bon état	Oui	Accessible	-
19-Re-008	DN50	12.5	7.5	Très bon état	Oui	Accessibile	Réducteur déjà équipé de manomètre (2020)
19-Re-004	DN60	-	-	HS	Non	Accessibile	HS
19-Re-005	DN60	13.5	7	Très bon état	Oui	Accessibile	Déjà équipé de manomètre
19-Re-013	DN40	-	-	Présente des traces de vieillissement	Non	Accessibile	Réducteur pour la STEP de la Rouchouse
19-Re-003	DN110	-	-	Présente des traces de vieillissement	Oui	Accessibile	-
19-Re-009	DN60	11	4	Très bon état	Oui	Accessibile	Déjà équipé de manomètre
19-Re-014	-	-	-	Présente des traces de vieillissement	Non	Accessibile	Réducteur complètement ensabléRouille
19-Re-015	DN40	-	-	Très bon état	Oui	Accessibile	Attention, l'équipement peut être compliqué à cause du mur

8. Les équipements de réseau

Vannes de sectionnement	Purges / vidanges	Chambres et ouvrage	Poteaux Incendies	Ventouses	Compteur généraux	Réducteurs	Total
617	285	5	101	161	24	14	1 207

AR Prefecture
043-214302242-20250918-2025_09_01-DE
Reçu le 19/09/2025

Annexe 2 - État des immobilisations transférées au 31 décembre 2024 pour la compétence eau :

Compte	N° INVENTAIRE	DÉSIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	DURÉE AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE
2031	22403-2022-03	SCHEMA DIRECTEUR PARTIE E	02/02/2024	0 an(s)	57 086,00	0,00	57 086,00
2138	22403-2004-04	INT STATION TRAITEMENT	31/12/2003	10 an(s)	2 338,98	2 204,00	134,98
2138	22403-2009-01	TRAVAUX STATION LA ROUCHO	13/08/2009	20 an(s)	35 139,45	26 354,00	8 785,45
2138	22403-2011-01	TRAVAUX MENUISERIE STATIO	01/02/2011	20 an(s)	3 389,27	2 197,00	1 192,27
2138	22403-2012-01	PORTES DE GARAGE DE LA ST	13/03/2012	10 an(s)	2 670,00	2 670,00	0,00
2138	22403-2013-01	ECHELLE DU RESERVOIR SURE	01/02/2013	10 an(s)	4 625,80	4 625,80	0,00
2138	22403-2016-02	ETANCHEITE RESERVOIRS STA	10/10/2016	50 an(s)	78 177,21	10 948,00	67 229,21
2138	22403-2017-05	PANNEAUX DE CLOTURE AU RE	01/12/2017	10 an(s)	2 600,81	1 820,00	780,81
2138	22403-213-001	RESRVOIR DE 400M3	31/12/1957	40 an(s)	22 562,45	22 562,45	0,00
2138	22403-213-002	RESRVOIR DE 50M3	31/12/1971	40 an(s)	2 286,74	2 286,74	0,00
2138	22403-213-003	STATION DE POMPAGE ET DE	31/12/1975	40 an(s)	69 555,56	69 555,56	0,00
2138	22403-213-004	GROSSES REPARATIONS STATI	31/12/1982	40 an(s)	16 933,00	16 933,00	0,00
2138	22403-213-005	STATION DE TRAIT LA ROUCH	31/12/1984	40 an(s)	323 907,82	323 907,82	0,00
21568	22403-2017-02	COMPTEURS D EAU	30/11/2017	10 an(s)	17 696,08	12 390,00	5 306,08
21568	22403-2018-01	COMPTEURS ET DIVERSES MAR	26/02/2018	10 an(s)	6 439,65	3 864,00	2 575,65
21568	22403-2019-01	COMPTEURS	13/12/2019	10 an(s)	52 206,42	26 105,00	26 101,42
21568	22403-2019-02	RÉSEAUX LES TAILLAS LE PR	01/04/2019	10 an(s)	760,00	228,00	532,00
21568	22403-2019-03	DEMARREUR PROGRESSIF ELEC	13/06/2019	10 an(s)	998,22	495,00	503,22
21568	22403-2020-01	COMPTEURS	04/03/2020	10 an(s)	34 291,58	13 716,00	20 575,58
21568	22403-2020-02	TRAVAUX AEP VAUBARLET	04/05/2020	10 an(s)	78 608,67	7 861,00	70 747,67
21568	22403-2020-03	TRAVAUX AEP RESEAUX TRANS	19/05/2021	10 an(s)	284 217,19	28 422,00	255 795,19
21568	22403-2020-05	AVENUE DE MARINEO EAP	14/08/2020	40 an(s)	13 691,00	1 026,00	12 665,00
21568	22403-2021-01	COMPTEURS D EAU 2021	05/11/2021	10 an(s)	17 490,92	5 247,09	12 243,83
21568	22403-2021-02	LA GARNA TRAVAUX	26/05/2023	10 an(s)	34 823,37	0,00	34 823,37
21568	22403-2021-04	BOBINAGE MOTEUR STATION D	31/08/2021	10 an(s)	3 375,00	1 013,50	2 361,50
21568	22403-2022-02	COMPTEURS D EAU 2022	02/05/2022	10 an(s)	25 255,86	5 052,00	20 203,86
21568	22403-2023-01	ACQUISITION COMPTEURS D E	02/11/2023	10 an(s)	15 335,90	1 533,59	13 802,31
21568	22403-2024-01	RESERVOIR BALLON ANTI BEL	16/01/2024	10 an(s)	6 468,14	0,00	6 468,14
21568	22403-2024-02	ACQUISITION COMPTEURS EAU	08/08/2024	10 an(s)	26 958,30	0,00	26 958,30
21568	22403-2024-03	DEBITMETRE A LA STATION D	25/03/2024	10 an(s)	2 541,60	0,00	2 541,60
2158	22403-1962-01	CANALISATON VILLAGES 1ER	01/01/1962	20 an(s)	32 837,52	32 837,52	0,00
2158	22403-1963-01	CANALISATON VILLAGES 2EME	01/01/1963	22 an(s)	77 200,18	77 200,18	0,00
2158	22403-1964-01	CANALISATON VILLAGES 3EME	01/01/1964	29 an(s)	38 417,15	38 417,15	0,00
2158	22403-1970-02	TX ADJUDICATION CANALISAT	01/01/1970	29 an(s)	17 920,08	17 920,08	0,00
2158	22403-1980-01	CANALISATONS PLEIN SUD	01/01/1980	35 an(s)	41 208,68	41 208,68	0,00
2158	22403-1982-01	CANALISATIONS DU BOURG	01/01/1982	36 an(s)	593 918,12	593 918,12	0,00
2158	22403-1986-01	AEP RUE ND DES ANGES	01/01/1986	38 an(s)	63 805,37	59 093,96	4 711,41
2158	22403-1986-02	AEP BERCARY	01/01/1986	38 an(s)	15 056,86	13 944,53	1 112,33
2158	22403-1987-02	AEP ST ROMAIN	01/01/1987	39 an(s)	19 283,57	17 654,59	1 628,98
2158	22403-1990-01	AEP ECARTS	01/01/1990	40 an(s)	342 986,40	287 627,82	55 358,58

AR Prefecture
043-214302242-20250918-2025_09_01-DE
Reçu le 19/09/2025

Annexe 2 - État des immobilisations transférées au 31 décembre 2024 pour la compétence eau :

Compte	N° INVENTAIRE	DÉSIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	DUREE AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE
2158	22403-1992-01	AEP ECARTS	01/01/1992	40 an(s)	5 758,62	4 607,06	1 151,56
2158	22403-1993-01	AEP LIAISON HLM-CENTRE	01/01/1993	40 an(s)	74 881,64	58 033,16	16 848,48
2158	22403-1993-02	AEP RUE DE ST DIDIER	01/01/1993	40 an(s)	92 034,22	71 326,90	20 707,32
2158	22403-1994-01	AEP ST ROMAIN	01/01/1994	40 an(s)	6 973,25	5 229,25	1 744,00
2158	22403-1995-01	EQUIPEMENT ELECTR RESERVO	01/01/1995	10 an(s)	11 647,87	11 647,87	0,00
2158	22403-1997-01	AEP CENTRE VILLE	01/01/1997	40 an(s)	35 683,79	24 086,48	11 597,31
2158	22403-1997-02	AEP AV DE MARINEO	01/01/1997	40 an(s)	61 608,95	41 585,52	20 023,43
2158	22403-1998-02	CONDUITE PEYRELAS	01/01/1998	40 an(s)	1 245,38	808,60	436,78
2158	22403-1999-01	RESEAU RUE FAYARD GUILLAU	01/01/1999	40 an(s)	46 962,83	29 350,25	17 612,58
2158	22403-1999-02	AEP LES TAILLAS	01/01/1999	40 an(s)	6 460,16	4 036,01	2 424,15
2158	22403-2000-01	RUE DE LA CROIX DES RAMEA	01/01/2000	40 an(s)	2 468,86	1 478,16	990,70
2158	22403-2000-02	RESEAU LA PONTCHARDIERE	01/01/2000	40 an(s)	17 984,31	10 789,68	7 194,63
2158	22403-2000-03	LES TROIS CROIX	01/01/2000	40 an(s)	1 389,56	830,64	558,92
2158	22403-2001-01	LE BOIS DE JAX	01/01/2001	40 an(s)	5 716,49	3 285,32	2 431,17
2158	22403-2001-02	AEP LA ROUE	01/01/2001	40 an(s)	279,90	157,78	122,12
2158	22403-2001-03	RUE DU PARVIS DE L EGLISE	01/01/2001	40 an(s)	26 834,84	15 427,94	11 406,90
2158	22403-2001-04	LES PATURAUX	01/01/2001	40 an(s)	11 396,10	6 549,71	4 846,39
2158	22403-2001-05	RTE DE LA BATIE	01/01/2001	40 an(s)	4 950,27	2 843,72	2 106,55
2158	22403-2002-01	AEP LES FLACHERES	01/01/2002	40 an(s)	5 972,15	3 278,00	2 694,15
2158	22403-2002-02	REFECTION LES FLACHERES	01/01/2002	5 an(s)	12 218,35	12 218,35	0,00
2158	22403-2002-03	MODIF RESEAU MES BLES DOR	01/01/2002	40 an(s)	1 310,30	704,00	606,30
2158	22403-2002-04	AV LAFAYETTE	01/01/2002	40 an(s)	122 956,60	67 606,00	55 350,60
2158	22403-2002-05	RUE DE LA PAIX	01/01/2002	40 an(s)	1 508,18	814,00	694,18
2158	22403-2002-06	RUE DES PASSEMENTIERS	01/01/2002	40 an(s)	2 977,63	1 628,00	1 349,63
2158	22403-2002-07	RUE DE LA GENDARMERIE	01/01/2002	40 an(s)	2 362,42	1 298,00	1 064,42
2158	22403-2002-08	ROCADE ST ROMAIN	01/01/2002	40 an(s)	1 079,81	572,00	507,81
2158	22403-2003-01	RESEAU CORNASSAC	01/01/2003	40 an(s)	16 732,06	8 778,00	7 954,06
2158	22403-2003-02	PLACEMENT RESEAU LA MEYNI	01/01/2003	40 an(s)	910,00	462,00	448,00
2158	22403-2003-03	CONDUITE REVEYROLLES	01/01/2003	40 an(s)	1 674,90	861,00	813,90
2158	22403-2003-04	ZI TRANCHE 6	01/01/2003	40 an(s)	22 084,00	11 592,00	10 492,00
2158	22403-2003-05	TX RUES	01/01/2003	40 an(s)	129 441,68	64 720,72	64 720,96
2158	22403-2003-06	SURPRESSEUR LES PATURAUX	31/12/2003	40 an(s)	49 002,07	24 500,90	24 501,17
2158	22403-2004-01	AMGT RUE BELVEDERE	31/12/2003	40 an(s)	6 962,65	3 481,26	3 481,39
2158	22403-2004-02	PLATEFORME MALAGUET	31/12/2003	40 an(s)	8 575,00	4 286,84	4 288,16
2158	22403-2004-03	EXT CHAMBEAU	31/12/2003	40 an(s)	5 255,89	2 627,20	2 628,69
2158	22403-2004-05	LA PONCHARDIERE	31/12/2003	35 an(s)	708,72	400,00	308,72
2158	22403-2004-06	REFECTION LA BATIE	31/12/2003	10 an(s)	5 670,49	5 670,49	0,00
2158	22403-2005-01	ZONE NA GARAY ST ROMAIN	31/12/2007	40 an(s)	21 009,00	8 925,00	12 084,00
2158	22403-2006-01	AMENAGT ROUTE D YSSINGEAU	31/12/2007	40 an(s)	96 862,55	41 157,00	55 705,55
2158	22403-2006-02	RUE AUSTREGESIL	31/12/2007	40 an(s)	1 081,75	459,00	622,75

AR Prefecture
043-214302242-20250918-2025_09_01-DE
Reçu le 19/09/2025

Annexe 2 - État des immobilisations transférées au 31 décembre 2024 pour la compétence eau :

Compte	N° INVENTAIRE	DÉSIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	DUREE AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE
2158	22403-2007-01	RESEAUX RUE DES JARDINS	31/12/2007	40 an(s)	1 100,91	459,00	641,91
2158	22403-2007-02	RESEAUX PONTCHARDIERE	31/12/2007	40 an(s)	4 357,75	1 836,00	2 521,75
2158	22403-2007-03	REFECTION RUE DU STADE	31/12/2007	40 an(s)	8 790,95	3 504,00	5 286,95
2158	22403-2007-04	RESEAUX LA GARNA	31/12/2007	40 an(s)	23 724,00	10 081,00	13 643,00
2158	22403-2008-01	EXTENSION RESEAU GRANGENE	31/01/2008	40 an(s)	1 268,75	496,00	772,75
2158	22403-2008-02	TUYAUTERIE INOX STATION L	26/02/2008	40 an(s)	3 276,00	1 296,00	1 980,00
2158	22403-2008-03	CONDUITE EAU LES RIOUSES	31/12/2008	40 an(s)	12 902,20	5 152,00	7 750,20
2158	22403-2008-04	RESEAU LOT LA COLLANGE	31/12/2008	40 an(s)	7 908,38	3 152,00	4 756,38
2158	22403-2009-02	ARMOIRE DE POMPAGE	15/12/2009	15 an(s)	22 850,00	22 850,00	0,00
2158	22403-2009-05	CONDUITE D'EAU LA COLLANG	22/04/2009	40 an(s)	1 781,00	660,00	1 121,00
2158	22403-2009-06	ASSAINISSEMENT QUARTIER E	20/11/2009	40 an(s)	44 092,12	15 492,00	28 600,12
2158	22403-2009-07	ASSAINISSEMENT QUARTIER E	10/12/2010	1 an(s)	300,00	300,00	0,00
2158	22403-2010-01	INSTALLATION ELECTRIQUE S	19/10/2010	15 an(s)	14 261,10	13 314,00	947,10
2158	22403-2011-02	2 SONDES ULTRASON STATION	10/03/2011	5 an(s)	2 595,00	2 595,00	0,00
2158	22403-2012-02	AMENAGEMENT RUE DU CALVAI	30/10/2012	40 an(s)	66 236,00	18 216,00	48 020,00
2158	22403-2013-03	ENFOUISSEMENT RESEAUX RUE	14/08/2013	40 an(s)	7 543,77	2 079,00	5 464,77
2158	22403-2013-04	ROND POINT MAIRIE	31/08/2013	40 an(s)	5 833,43	1 606,00	4 227,43
2158	22403-2013-05	TELEGESTION DES RESERVOIR	22/04/2014	20 an(s)	22 215,00	11 110,00	11 105,00
2158	22403-2014-01	RESEAUX RUE FAYARD GUILLA	08/08/2014	40 an(s)	6 207,08	1 550,00	4 657,08
2158	22403-2014-02	AUTOMATE CONTROLEUR ET 2	18/12/2014	10 an(s)	2 036,00	2 036,00	0,00
2158	22403-2015-01	SONDES POUR STATION LA RO	23/02/2015	10 an(s)	744,00	666,00	78,00
2158	22403-2015-02	RESEAUX RUE DES RIOUZES	14/12/2015	40 an(s)	52 034,10	7 806,00	44 228,10
2158	22403-2016-01	TRAVAUX SUR RESEAU EAU PO	13/06/2016	40 an(s)	2 987,00	525,00	2 462,00
2158	22403-2017-01	PIÈCES POUR STATION LA RO	23/05/2017	10 an(s)	1 917,88	1 344,00	573,88
2158	22403-2017-03	AMENAGEMENT PLACE AFN	04/07/2017	40 an(s)	10 529,00	1 052,00	9 477,00
2158	22403-2017-04	CANALISATION EAU POTABLE	18/07/2017	40 an(s)	7 373,00	1 104,00	6 269,00
2158	22403-2017-06	ARMOIRE ELECTRIQUE SURPRE	14/12/2017	10 an(s)	4 718,40	3 304,00	1 414,40
2158	22403-2018-02	POMPE POUR SURPRESSEUR ZI	12/04/2018	40 an(s)	1 394,12	240,00	1 154,12
2158	22403-2018-03	AMÉNAGEMENT ESPACE JEAN C	04/05/2018	10 an(s)	2 246,00	900,00	1 346,00
2158	22403-2018-04	REFECTION RESEAUX ROUTE D	17/09/2018	40 an(s)	62 236,29	4 668,00	57 568,29
2158	22403-2018-05	VILLAGE LA BATIE-CHEMIN C	27/11/2018	40 an(s)	16 900,70	1 269,00	15 631,70
2158	22403-2024-04	VESSIE POUR BALLON DE POM	08/06/2024	10 an(s)	3 641,00	0,00	3 641,00
2158	22403-2024-06	POMPE SUBMERSIBLE STATION	02/09/2024	10 an(s)	1 507,55	0,00	1 507,55
2158	22403-215-001	CANALISATON DE REFOULEMEN	01/01/1957	40 an(s)	45 094,42	45 094,42	0,00
2158	22403-215-002	CANALISATON DU BOURG	01/01/1957	20 an(s)	105 923,39	105 923,39	0,00
21788	22403-217-001	STATION DE POMPAGE	01/01/1957	10 an(s)	62 934,65	62 934,65	0,00
21788	22403-217-002	STATION DE POMPAGE	01/01/1969	10 an(s)	17 592,62	17 592,62	0,00
21788	22403-217-003	STATION DE POMPAGE	01/01/1984	15 an(s)	132 187,85	132 187,85	0,00
21788	22403-217-004	NOUVELLES POMPES AU RESER	01/01/1987	15 an(s)	20 349,55	20 349,55	0,00
21788	22403-217-005	CHLOROMETRES STATION POMP	01/01/1998	15 an(s)	5 640,61	5 640,61	0,00

AR Prefecture
043-214302242-20250918-2025_09_01-DE
Reçu le 19/09/2025

Annexe 2 - État des immobilisations transférées au 31 décembre 2024 pour la compétence eau :

Compte	N° INVENTAIRE	DÉSIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	DUREE AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE
2315	22403-2021-03	TRAVAUX RUE NOTRE DAME DE	05/12/2024	0 an(s)	196 779,59	0,00	196 779,59
2315	22403-2022-01	ROUTE DE MONISTROL	27/01/2022	0 an(s)	1 995,00	0,00	1 995,00
2315	22403-2024-05	MOE TRAVAUX RESEAU TRANSF	04/08/2024	0 an(s)	8 424,00	0,00	8 424,00
2315	22403-2024-07	TUBES PVC DIVERSES FOURNI	01/11/2024	0 an(s)	6 257,10	0,00	6 257,10
2315	22403-90008398730512	MOE RUE NOTRE DAME DES AN	09/12/2024	0 an(s)	4 011,86	0,00	4 011,86
2315	22403-90008402983412	LOCATION PELLE PC58 ET PE	11/12/2024	0 an(s)	1 860,00	0,00	1 860,00
275	22403-275-001	OXYGENE	31/12/1995	0 an(s)	304,90	0,00	304,90
Grand Somme					**4 452 562,18**	**2 861 339,08**	**1 591 223,10**

AR Prefecture
043-214302242-20250918-2025_09_01-DE
Reçu le 19/09/2025

3 - État des subventions transférables au 31 décembre 2024 pour la compétence eau :

N° d'auxiliaire	Libellé	Comptes	Montant de la subvention	Total des reprises antérieures	**Valeur nette comptable ou montant restant à reprendre**
22403-2006-01	AMENAGT ROUTE D YSSINGEAU	1318	34 487,00		19 835,00
22403-2006-01	AMENAGT ROUTE D YSSINGEAU	13918		14 652,00	
22403-2018-04	REFECTION RESEAUX ROUTE D	1318	28 493,63		26 357,63
22403-2018-04	REFECTION RESEAUX ROUTE D	13918		2 136,00	
22403-2022-03	SCHEMA DIRECTEUR PARTIE E	1318	47 341,18		47 341,18
			110 321,81	16 788,00	93 533,81

AR Prefecture
043-214302242-20250918-2025_09_01-DE
Reçu le 19/09/2025

Annexe 4 État des emprunts transférés au 31 décembre 2024 pour la compétence eau :

Commune	Budget	N° PRÊT	BQ	CODE TRESO	Année	Capital emprunté	Capital restant dû au 31/12/2024	Taux	Date Échéance 2025	Dernière Échéance
STE SIGOLENE	**AEP**	5629884	Bq Territoires - CDC	224E01	2024	220 000,00 €	220 000,00 €	3,400	18/05/2025	2050
